

Anexo II

Acompanhamento do

Orçamento de

Investimentos 2011

1. Quanto ao prazo de fechamento mensal

O art. 3º do Decreto nº 3735, de 24 de janeiro de 2001, determinou que a inserção dos dados referentes ao Orçamento de Investimentos, deverá ser feito até o dia 20 do mês subsequente ao de referência, no Sistema Integrado das Empresas Estatais - SIEST.

2. Valores para 2011

| Base Legal | Suplementação | Cancelamento | Total Aprovado |
|---|------------------------|-------------------------|------------------------|
| Decreto s/nº, de 28/01/2011 | R\$ 31.000.000 | R\$ 0 | R\$ 31.000.000 |
| Lei nº 12.381, de 09/02/2011 (LOA/2011) | R\$ 124.148.499 | R\$ 0 | R\$ 124.148.499 |
| Portaria nº 124, de 01/06/2011 | R\$ 12.914.605 | (R\$ 12.914.605) | R\$ 0 |
| Decreto s/nº, de 24/06/2011 | R\$ 3.149.565 | R\$ 0 | R\$ 3.149.565 |
| Créditos em Andamento | R\$ 4.727.211 | (R\$ 5.435.655) | (R\$ 708.444) |
| TOTAL | R\$ 175.939.880 | (R\$ 18.350.260) | R\$ 157.589.620 |

3. Valores realizados em 2011

No exercício foram realizados **2,9%** do total aprovado, perfazendo um montante de **R\$ 4.499.551,53**.

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

1) Projeto: 26.784.1458.10VS.0033

Ação: Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS-CODE) no Porto de Itaguaí (RJ)

Finalidade: Dotar as instalações portuárias do Porto de Itaguaí de condições de segurança e prevenção à ameaça de ataques terroristas e outros ilícitos que comprometam sua atividade.

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--|
| Valor do Projeto: | R\$ 22.422.668,00 | Realizado até 2010: | R\$ 9.009.651,01 |
| Saldo Financeiro | | R\$ 7.567.131,00 | (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) |
| Saldo Financeiro (Mudança de Fonte) | | (R\$ 3.000.000,00) | (Portaria nº 124, de 01/06/2011) |
| Restos a Pagar | | R\$ 3.000.000,00 | (Portaria nº 124, de 01/06/2011) |
| Créditos aprovados em 2011: | | R\$ 7.567.131,00 | Meta Física: 47,0 % |
| Recursos Disponíveis | | R\$ 4.687.705,24 | |
| Total compromissado | | R\$ 4.331.747,01 | |
| Realizado em 2011: | | R\$ 1.679.394,40 | Execução Física: 10,4% |

Resultados Alcançados até 2010

Instalação e fornecimento de equipamentos para implantação do Sistema Integrado de Segurança (SIS) – contrato 107/2005; Obras de reforma do prédio da SUPGUA no ITAPOR – contrato 109/2005; Aquisição de micro-ônibus para a SUPGUA no ITAPOR – contrato 105/2005; aquisição de boias de sinalização náutica para o canal de acesso do Porto de Itaguaí; construção de cercas para casas de transferências de energia; Pagamento da 1ª a 9ª medições da Siemens, referente à implantação do SIS-ITAPOR; Aquisição de grupo gerador para a superintendência da guarda portuária; Obra de fechamento das guaritas do ITAPOR; Construção de muro fronteiro do Vilar de Coqueiros; Logon Construções e Consultoria Técnica em Engenharia Ltda – 2ª e 3ª medições referentes à adequação das instalações de acesso do Porto de Itaguaí – ISPS-CODE; Aquisição de 30.000 cartões de identificação – O.F 040/2008. Pagamento da 1ª a 5ª medições do contrato 037/2009 com a Construtora W.V. LTDA, referente à ampliação da portaria principal do Porto de Itaguaí; Construtora W.V. LTDA – Termo de rescisão amigável 069/2009 referente ao contrato 027/2008. Ampliação da Portaria Principal do Porto de Itaguaí – contrato C-SUPJUR 037/2009 com a Construtora W.V. LTDA – pagamento da 6ª a 13ª medições e reajustamentos da 12ª e 13ª medições. Complementação do balizamento do canal de acesso ao Porto de Itaguaí – contrato C-SUPJUR 059/2010 com RIO INTERPORT CONSULT. ENGENHARIA LTDA – pagamento da 1ª medição.

Resultados Alcançados em 2011

Complementação do balizamento do canal de acesso ao Porto de Itaguaí

O contrato C-SUPJUR Nº 059/2010 com RIO INTERPORT CONSULT. ENGENHARIA LTDA está concluído. O contrato teve, em 2011, o montante de R\$ 54.405,00 executado referente ao pagamento da 2ª medição.

Pavimentação da portaria principal do Porto de Itaguaí (RJ)

O contrato C-SUPJUR Nº 018/2011 com CONSTRUTORA W.V. LTDA está com a execução paralisada. O contrato teve, em 2011, o montante de R\$ 1.315.541,42 executado referente ao pagamento da 1ª a 3ª medições.

Ampliação da Portaria Principal do Porto de Itaguaí

O contrato C-SUPJUR Nº 037/2009 com CONSTRUTORA W.V. LTDA teve o 4º Termo Aditivo assinado em 01/06/2011 estabelecendo prazo contratual em 29(vinte e nove) dias a contar da sua assinatura. O montante de R\$ 309.447,98, executado em Agosto, refere-se ao pagamento da 14ª medição e reajustamento da 14ª medição.

A Realizar

Serviços de recuperação e melhorias do Sistema Integrado de Segurança do Porto de Itaguaí (RJ)

O contrato C-SUPJUR Nº 057/2011 com EXPERNET TELEMÁTICA LTDA foi assinado em 03/08/2011. O valor deste contrato é de R\$ 2.399.500,00 (dois milhões trezentos e noventa e nove mil e quinhentos reais) e o prazo é de 12(doze) meses, conforme extrato de contrato publicado no DOU de 16/08/2011.

Contratação de empresa para elaboração de análise de risco e plano de segurança pública portuária – PSPP.

O processo foi encaminhado para DIREXE.

Construção de guaritas e edificação para gerador de emergência na portaria principal do Porto de Itaguaí (RJ).

O processo foi encaminhado para DIREXE.

2) Projeto: 26.784.1458.10VW.0033

Ação: Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS-CODE) no Porto do Rio de Janeiro (RJ)

Finalidade: Dotar as instalações portuárias do Porto do Rio de Janeiro de condições de segurança e prevenção à ameaça de ataques terroristas e outros ilícitos que comprometam sua atividade.

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Valor do Projeto: | R\$ 28.558.431,00 | Realizado até 2010: | R\$ 11.308.252,07 |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|--|---------------|
| Saldo Financeiro | R\$ 9.307.592,00 | (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) | |
| Saldo Financeiro (Mudança de Fonte) | (R\$ 3.000.000,00) | (Portaria nº 124, de 01/06/2011) | |
| Restos a Pagar | R\$ 3.000.000,00 | (Portaria nº 124, de 01/06/2011) | |
| Restos a Pagar | R\$ 1.236.387,00 | (Decreto s/nº, de 24/06/2011) | |
| Créditos aprovados em 2011: | R\$ 10.543.979,00 | Meta Física: | 40,0 % |
| Recursos Disponíveis | R\$ 7.543.979,00 | | |
| Total comprometido | R\$ 2.788.908,18 | | |
| Realizado em 2011: | R\$ 39.939,00 | Execução Física: | 0,2% |

Resultados Alcançados até 2010

Aquisição de 170 pistolas marca TAURUS calibre 38 e munições; aquisição de 30 aparelhos de ar condicionado para a SUPGUA; Obras de adaptação do prédio da guarda, custas cartônicas e lavratura de três procurações – contrato 016/2006; aquisição de sistema de controle de acesso e de segurança aos portos do RJ; serviço de assessoria técnica na implantação do ISPS-CODE nos portos do RJ; aquisição de seis veículos do tipo pick-up cabine dupla; aquisição de binóculos para visão noturna; aquisição de 12 bancos tipo longarina, sendo 9 de 3 lugares e 3 de 5 lugares; aquisição de doze rádio comunicadores; aquisição de um aparelho de TV de 29” e um vídeo cassete de 7 cabeças; aquisição de 50 cadeiras tipo secretária; aquisição de 3 cadeiras tipo diretor espaldar alto, 4 cadeiras tipo diretor espaldar médio, 20 cadeiras tipo chefia, 12 mesas tipo chefia, 1 mesa redonda para reunião e 50 poltronas de auditório com prancheta; aquisição de 2 armários de aço; aquisição de seis aparelhos de faxes à laser com copadora e identificador de chamadas; aquisição de software de identificação para a SUPGUA; aquisição de seis motos para SUPGUA; aquisição de material de informática; projeto de adaptação do prédio da SUPGUA para o ISPS-CODE; aquisição de máquina fragmentadora de papel; aquisição de no-break; implantação do ISPS-CODE nos portos do RJ e Itaguaí; aquisição de armários de aço; aquisição de câmera qeb para SUPGUA; aquisição de máquina fotográfica e filmadora; aquisição de impressora de etiquetas; aquisição de equipamentos de ginástica; aquisição de mesas e armários; aquisição de 19 bebedouros; aquisição de microcomputadores; contratação dos serviços de pavimentação asfáltica e infraestrutura de iluminação no Porto do RJ – Constr WV Ltda; construção, reforma e adaptação das portarias do Porto do RJ firmado com a Giver Engenharia Ltda – contrato 108/2005; aquisição de bóias de sinalização náutica para os portos do Rio e Niterói; aquisição de 21 conjuntos de defensas, visando a segurança de embarcações e instalações portuárias; Implantação da sinalização horizontal de áreas adjacentes ao RIOPOR; obras de fechamento de guaritas; Implantação de bóias de sinalização náutica no RIOPOR; serviços de podas de árvores no Porto do Rio; Projeto para integração de sistemas de segurança portuária e aduaneira; Projeto executivo da nova sede da SUPGUA para atendimento ao ISPS-CODE; Projeto de engenharia do VTS-Monitoramento do tráfego marítimo; Pagamento das 1ª a 9ª medições da Siemens, referente a implantação do Sistema Integrado de Segurança - SIS-RIOPOR; Despesas com projeto do sistema de iluminação no RIOPOR; Aquisição de 4 Bastões Anti-tumulto; Pagamento da 2ª parcela de cartões de aproximação; Pagamento da 3ª medição do projeto de monitoramento das embarcações dentro das áreas do Porto Organizado; Aquisição de grupo gerador para a superintendência da guarda portuária; Pagamento da 1ª medição do Sistema de GIS, do RIOPOR; Pagamento da 1ª e 2ª medições do contrato 086/2009 com a Hansalufbild Geo Informações Ltda, referente ao Projeto de implantação de um sistema de informações geo referenciais; Pagamento referente ao 1º termo aditivo do contrato 086/2009.

Construção da Sede da Guarda Portuária – contrato C-SUPJUR 027/2010 com MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS S/A – pagamento da 1ª a 3ª medições.

Fornecimento e instalação de proteção e segurança para o armazém 15 do porto do Rio de Janeiro – contrato C-SUPJUR 068/2010 com NOVA QUADRANTE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA – pagamento da medição única.

Resultados Alcançados em 2011

Implantação de dispositivos de segurança para acesso de pedestres no portão 24 do Porto do Rio de Janeiro
O contrato C-SUPJUR Nº 098/2010 com TRAFEG SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DE TRANSITO LTDA teve o montante de R\$ 39.939,00 executado em Junho e Julho referente ao pagamento da 1ª e 2ª medições.

A Realizar

Construção da Sede da Guarda Portuária
O contrato C-SUPJUR 027/2010 com MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS S/A teve a execução interrompida pois a construção da sede da Guarda Portuária está sem licença da Prefeitura (RJ).

Serviços de Recuperação e Melhorias do Sistema Integrado de Segurança do Porto do Rio de Janeiro
O contrato C-SUPJUR Nº 057/2011 com EXPERNET TELEMÁTICA LTDA foi assinado em 03/08/2011. O valor deste contrato é de R\$ 2.399.500,00 (dois milhões trezentos e noventa e nove mil e quinhentos reais) e o prazo de execução é de 12(doze) meses, conforme extrato de contrato publicado no DOU de 16/08/2011.

A ação está sendo utilizada para aquisição dos seguintes equipamentos pela SUPGUA:

Aquisição de Porta Tonfas, conforme pedido de compra nº 5004/2011 efetuado pelo Superintendente da Guarda Portuária.
Aquisição de Armas não Letais, conforme pedido de compra nº 5333/2011 efetuado pelo Superintendente da Guarda Portuária.
Aquisição de Nobreak para a SUPGUA.
Aquisição espargidor de agente de pimenta para a SUPGUA.
Aquisição colete de Proteção Balística nível IIIA.

3) Projeto: 26.784.1458.100Y.0033

Ação: Recuperação da Pavimentação das Vias Internas do Porto do Rio de Janeiro (RJ)

Finalidade: Promover a drenagem de águas pluviais e recuperação da pavimentação a fim de evitar a formação de poças, melhorando a segurança no trânsito de veículos rodoviários e ferroviários.

| | | | |
|------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--|
| Valor do Projeto: | R\$ 2.900.000,00 | Realizado até 2010: | R\$ 699.275,00 |
| Geração Própria | | R\$ 1.300.000,00 | (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) |
| Créditos aprovados em 2011: | | R\$ 1.300.000,00 | Meta Física: |
| Recursos Disponíveis | | R\$ 325.000,00 | 45,0 % |
| Total compromissado | | R\$ 1.294.171,65 | |
| Realizado em 2011: | | R\$ 0,00 | Execução Física: |
| | | | 0,0 % |

Resultados Alcançados até 2010

Pagamento da 1ª a 6ª medições do contrato C-SUPJUR 117/08 – Recuperação da pavimentação de áreas internas do Porto do Rio de Janeiro.

Resultados Alcançados em 2011

Não há realizações no exercício.

A Realizar

Recuperação da pavimentação das vias internas do Porto do Rio de Janeiro

A CONCORRÊNCIA Nº 002/2011 está em fase de julgamento das propostas de preço.

4) Projeto: 26.784.1458.11HG.0033

Ação: Implantação do Sistema de Defensas no Porto do Rio de Janeiro (RJ)

Finalidade: Destina-se a dotar o Porto do Rio de Janeiro de melhores condições para atracação dos navios e proteção do paramento do cais em conformidade com a Lei 8.630/93.

| | | | |
|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--|
| Valor do Projeto: | R\$ 10.000.000,00 | Realizado até 2010: | R\$ 9.842.046,00 |
| Orçamento Fiscal / 2011 | | R\$ 1.358.000,00 | (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) |
| Saldo Financeiro | | R\$ 1.708.476,00 | (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) |
| Créditos aprovados em 2011: | | R\$ 3.066.476,00 | Meta Física: |
| Recursos Disponíveis | | R\$ 0,00 | 31,0% |
| Total compromissado | | R\$ 0,00 | |
| Realizado em 2011: | | R\$ 0,00 | Execução Física: |
| | | | 0,0 % |

Resultados Alcançados até 2010

Pagamento da 1ª a 7ª medições do contrato 023/2006 referente à fabricação, transporte e montagem de defensas no Porto do Rio de Janeiro, firmado com a Ponta Leste Angra Atividades Subaquáticas.
Fornecimento e instalação de defensas para o Porto do Rio de Janeiro – contrato C-SUPJUR 099/2009 com COPABO INFRAESTRUTURA MARÍTIMA LTDA – pagamento da 1ª a 12ª medições.

Resultados Alcançados em 2011

Não há realizações no exercício.

A Realizar

Aquisição das primeiras defensas sobressalentes

O processo está em fase de elaboração do Edital de licitação.

5) Projeto: 26.784.1458.12IE.0033

Ação: Recuperação do Sistema Viário Interno do Porto de Itaguaí (RJ)

Finalidade: Pavimentação asfáltica da pista de acesso interno ao portão da Ilha da Madeira do Porto de Itaguaí.

| | | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------------------|--|
| Valor do Projeto: | R\$ 9.500.000,00 | Realizado até 2010: | R\$ 3.318.477,93 |
| Saldo Financeiro | | R\$ 985.436,00 | (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) |

| | | | |
|--|-----------------------|----------------------------------|---------------|
| Saldo Financeiro (Mudança de Fonte) | (R\$ 508.451,00) | (Portaria nº 124, de 01/06/2011) | |
| Restos a Pagar | R\$ 508.451,00 | (Portaria nº 124, de 01/06/2011) | |
| Créditos aprovados em 2011: | R\$ 985.436,00 | Meta Física: | 10,0 % |
| Recursos Disponíveis | R\$ 0,00 | | |
| Total comprometido | R\$ 0,00 | | |
| Realizado em 2011: | R\$ 0,00 | Execução Física: | 0,0 % |
| Resultados Alcançados até 2010 | | | |
| Serviços de recuperação e implantação da pavimentação asfáltica na pista interna de acesso à Ilha da Madeira no Porto de Itaguaí. Pavimentação da pista 500 do Porto de Itaguaí – contrato C-SUPJUR 106/2009 com CONSTRUTORA W.V. LTDA – pagamento da 1ª a 4ª medições, respectivos reajustamentos e 1º Termo Aditivo. Pavimentação da pista 200 do Porto de Itaguaí – contrato C-SUPJUR 051/2010 com CONSTRUTORA W.V. LTDA – pagamento da 1ª e 2ª medições. | | | |
| Resultados Alcançados em 2011 | | | |
| Não há realizações no exercício. | | | |
| A Realizar | | | |
| Construção de dois acostamentos da Pista 200 entre a portaria principal e o viaduto O processo está em fase de elaboração do Edital de licitação. | | | |

6) Projeto: 26.784.1458.12IG.0033

Ação: Implantação do Centro Avançado de Controle de Tráfego do Porto de Itaguaí

Finalidade: Criação de Truck Center para desenvolver as atividades de obtenção de permissões de acesso junto à Guarda Portuária, vistoria das carretas, pesagem e apoio logístico para os caminhoneiros.

| | | | |
|---|--------------------------|--|-----------------|
| Valor do Projeto: | R\$ 12.500.000,00 | Realizado até 2010: | R\$ 0,00 |
| Orçamento Fiscal / 2011 | R\$ 7.000.000,00 | (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) | |
| Saldo Financeiro | R\$ 3.033.923,00 | (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) | |
| Créditos aprovados em 2011: | R\$ 10.033.923,00 | Meta Física: | 80,0 % |
| → | | | |
| Recursos Disponíveis | R\$ 3.032.923,00 | | |
| Total comprometido | R\$ 0,00 | | |
| Realizado em 2011: | R\$ 0,00 | Execução Física: | 0,0 % |
| Resultados Alcançados até 2010 | | | |
| Não há realizações no período. | | | |
| Resultados Alcançados em 2011 | | | |
| Não há realizações no exercício. | | | |
| A Realizar | | | |
| Observação: A ação encontra-se com o Projeto Básico concluído com valor inicial de R\$ 6.918.708,20 a preço de 2006. Atualmente, está em fase de atualização de preços e elaboração das especificações técnicas para conclusão do Edital. | | | |

7) Projeto: 26.784.1458.12IL.0033

Ação: Complementação das Obras do Complexo Administrativo Portuário no Porto de Itaguaí (RJ)

Finalidade: Dotar o porto de instalações de atendimento adequadas aos usuários que demandam pelos Órgãos Intervenientes e Administração do Porto, evitando conflito no fluxo de pedestres, equipamentos portuários e veículos que circulam na via lindeira ao porto.

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|
| Valor do Projeto: | R\$ 600.000,00 | Realizado até 2010: | R\$ 0,00 |
|--------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|

| | | | |
|---|-----------------------|--|----------------|
| Orçamento Fiscal / 2011 | R\$ 600.000,00 | (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) | |
| Créditos aprovados em 2011: | R\$ 600.000,00 | Meta Física: | 100,0 % |
| Recursos Disponíveis | R\$ 0,00 | | |
| Total comprometido | R\$ 598.102,46 | | |
| Realizado em 2011: | R\$ 0,00 | Execução Física: | 0,0 % |
| Resultados Alcançados até 2010 | | | |
| Não há realizações no período. | | | |
| Resultados Alcançados em 2011 | | | |
| Não há realizações no exercício. | | | |
| A Realizar | | | |
| Obras Complementares do Prédio do Complexo Administrativo Portuário do Porto de Itaguaí (RJ) | | | |
| A licitação foi concluída em 23 de junho de 2009. A CI-SUPENG Nº 6364/2011 informou que o contrato não foi assinado pois a ação não havia sido contemplada no Orçamento de Investimento em 2010. A ação tem, em 2011, dotação aprovada de R\$ 600.000,00. O repasse do recurso foi solicitado pela CARTA-DIREPRE 7698/2011 datada de 30/03/2011. Aguardando recursos financeiros para assinatura do contrato. O prazo para execução dos serviços é de 6 meses a contar da liberação dos recursos. | | | |

8) Projeto: 26.784.1458.12LG.0033

Ação: Reforço Estrutural do Cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro (RJ)

Finalidade: Possibilitar o Porto do Rio de Janeiro de reforço estrutural nas instalações do Cais da Gamboa, para recebimento de navios de calado de -13,5m, a fim de atender a crescente demanda de exportação em navegação de longo curso.

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------------|--|---------------|
| Valor do Projeto: | R\$ 120.000.000,00 | Realizado até 2010: | -- |
| Orçamento Fiscal / 2011 | R\$ 12.000.000,00 | (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) | |
| Créditos aprovados em 2011: | R\$ 12.000.000,00 | Meta Física: | 25,0 % |
| Recursos Disponíveis | R\$ 0,00 | | |
| Total comprometido | R\$ 12.000.000,00 | | |
| Realizado em 2011: | R\$ 0,00 | Execução Física: | 0,0 % |
| Resultados Alcançados em 2011 | | | |
| Não há realizações no exercício. | | | |
| A Realizar | | | |

Contratação de empresa de engenharia especializada para a prestação de serviços de "REFORÇO ESTRUTURAL DO CAIS DA GAMBOA NO PORTO DO RIO DE JANEIRO"

A CONCORRÊNCIA Nº 005/2011 está marcada para 14/12/2011, conforme Aviso de Licitação publicado no DOU de 28/10/2011.

Observação:

O pedido de repasse dos recursos aprovados na LOA/2011 foi efetivado através da CARTA-DIREPRE Nº 15.993/2011 datada de 29 de junho de 2011, uma vez que estão concluídos os Estudos de Viabilidade Técnica Econômica – EVTE aprovados pela DIREXE e pelo CONSAD, bem como realizada Audiência Pública em 09/06/2011.

Contratação dos serviços de gerenciamento e fiscalização para as obras de reforço estrutural do cais da Gamboa

O processo foi encaminhado para DIREXE.

9) Projeto: 26.784.1458.12LH.0033

Ação: Reforço Estrutural do Cais de São Cristóvão no Porto do Rio de Janeiro (RJ)

Finalidade: Efetuar o reforço estrutural do Cais de São Cristóvão, no Porto do Rio de Janeiro, para o recebimento de navios de calado até -13,5m, a fim de atender a crescente demanda de exportação e navegação de longo curso.

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|--|-----------|
| Valor do Projeto: | R\$ 80.000.000,00 | Realizado até 2010: | -- |
| Orçamento Fiscal / 2011 | R\$ 8.000.000,00 | (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) | |

| | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------|
| Créditos aprovados em 2011: | R\$ 8.000.000,00 | Meta Física: | 37,0% |
| Recursos Disponíveis | R\$ 0,00 | | |
| Total comprometido | R\$ 0,00 | | |
| Realizado em 2011: | R\$ 0,00 | Execução Física: | 0,0 % |
| Resultados Alcançados em 2011 | | | |
| Não há realizações no exercício. | | | |
| A Realizar | | | |
| Observação: A ação está aguardando novas definições quanto a viabilidade de sua execução. | | | |

10) Projeto: 26.784.1458.12LI.0033

Ação: Implantação de 3 Píeres de Atracação no Porto do Rio de Janeiro (RJ)

Finalidade: Atender à demanda do turismo marítimo, melhorando a qualidade do atendimento ao embarque e desembarque de passageiros e tripulantes e atracação de navios.

| | | | |
|------------------------------------|---------------------------|--|-----------------|
| Valor do Projeto: | R\$ 314.000.000,00 | Realizado até 2010: | R\$ 0,00 |
| Orçamento Fiscal / 2011 | R\$ 47.000.000,00 | (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) | |
| Restos a Pagar | R\$ 31.000.000,00 | (Decreto s/nº, de 28/01/2011) | |
| Créditos aprovados em 2011: | R\$ 78.000.000,00 | Meta Física: | 26,0 % |
| Recursos Disponíveis | R\$ 47.529.130,40 | | |
| Total comprometido | R\$ 2.803.877,19 | | |
| Realizado em 2011: | R\$ 529.130,40 | Execução Física: | 0,2 % |

Resultados Alcançados até 2010

Não há realizações no período.

Resultados Alcançados em 2011

Contratação de empresa de engenharia especializada para a prestação de serviços de Caracterização Geológica - Geotécnica do Corpo Rochoso Existente na Projeção dos píeres de Atracação de Navios de Passageiros no Porto do Rio de Janeiro (RJ)
O contrato C-SUPJUR Nº 034/2011 com GEODRILL ENGENHARIA LTDA está em execução – pagamento da 1ª e 2ª medições.

A Realizar

Contratação de empresa de engenharia especializada para a prestação de serviços de "CONSTRUÇÃO DO PIER DE ATRACAÇÃO DESTINADO A NAVIOS DE PASSAGEIROS NO PORTO DO RIO DE JANEIRO"

A CONCORRÊNCIA Nº 006/2010 está marcada para dia 29/11/2011, conforme Aviso de Licitação publicado no DOU de 25/10/2011.

Contratação dos serviços de engenharia consultiva para gerenciamento e fiscalização das obras de adequação do terminal de passageiros do Porto do Rio de Janeiro

O processo foi encaminhado para DIREXE.

11) Projeto: 26.784.1458.131E.0033

Ação: Modernização de Elevadores da Sede da CDRJ e do Porto do Rio de Janeiro

Finalidade: Modernizar o sistema de comando e controle dos elevadores instalados no Edifício Sede da CDRJ e dos elevadores instalados no Porto do Rio de Janeiro, substituindo os painéis de comando a relé, através da instalação de painéis eletrônicos capazes de oferecer ao usuário melhor desempenho, conforto e segurança.

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| Valor do Projeto: | R\$ 740.000,00 | Realizado até 2010: | R\$ 290.830,00 |
| Geração Própria | R\$ 502.000,00 | (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) | |

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| Créditos aprovados em 2011: | R\$ 502.000,00 | Meta Física: | 68,0 % |
| Recursos Disponíveis | R\$ 276.620,17 | | |
| Total compromissado | R\$ 473.272,00 | | |
| Realizado em 2011: | R\$ 206.400,04 | Execução Física: | 28,0 % |

→

Resultados Alcançados até 2010

Serviço de modernização dos elevadores do Edifício Sede da CDRJ – contrato C-SUPJUR 097/2009 com ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A – pagamento da 1ª a 4ª parcelas e respectivos reajustamentos.

Resultados Alcançados em 2011

Serviço de modernização dos elevadores do edifício sede da CDRJ

O contrato C-SUPJUR Nº 097/2009 com ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A está em execução – pagamento da 5ª parcela.

Fornecimento e instalação de novos elevadores no edifício-sede do Porto do Rio de Janeiro

O contrato C-SUPJUR Nº 033/2011 com MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA foi assinado em 27/05/2011. O valor do contrato é de R\$ 389.900,00 (trezentos e oitenta e nove mil e novecentos reais) e o prazo é de 150 (cento e cinquenta) dias. O montante de R\$ 105.330,04, executado em Julho, refere-se a assinatura do contrato e aprovação do Projeto Executivo.

12) Projeto: 26.305.1458.20BA.0033

Ação: Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza

Finalidade: Combater o risco de entrada e a disseminação do vírus da influenza aviária ou de um eventual subtipo viral responsável por uma nova pandemia de influenza no território nacional.

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------|--|------------------|
| Valor do Projeto: | R\$ 877.000,00 | Realizado até 2010: | R\$ 0,00 |
| Orçamento Fiscal / 2011 | R\$ 777.000,00 | (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) | |
| Créditos aprovados em 2011: | R\$ 777.000,00 | Meta Física: | 89,0 unid |
| Recursos Disponíveis | R\$ 777.000,00 | | |
| Total compromissado | R\$ 395.477,91 | | |
| Realizado em 2011: | R\$ 55.010,00 | Execução Física: | 6,3 unid |

Resultados Alcançados até 2010

Não há realizações no período.

Resultados Alcançados em 2011

Serviços de fornecimento e instalação de salas de videoconferência nos Portos do Rio de Janeiro e Itaguaí (RJ)

O contrato C-SUPJUR Nº 083/2010 com SEAL TELECOM COM. E SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA teve o montante de R\$ 55.010,00 executado em Maio de 2011.

A Realizar

Contratação de empresa de engenharia especializada para a prestação de serviços de "IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - UERS, NO PORTO DO RIO DE JANEIRO"

A CONCORRÊNCIA Nº 003/2011 teve o resultado do julgamento da proposta de preços publicado no DOU de 26/10/2011. A licitante CONPORT ENGENHARIA LTDA foi classificada por cumprir todas as exigências Editalícias.

13) Projeto: 26.784.1458.3E70.0033

Ação: Recuperação do Acesso Rodoferroviário do Porto do Rio de Janeiro.

Finalidade: Melhorar os acessos rodoviários e desobstruir o ramal ferroviário Arará/Jacarezinho de acesso ao Porto do Rio de Janeiro.

| | | | |
|------------------------------------|--------------------------|--|-------------------------|
| Valor do Projeto: | R\$ 10.000.000,00 | Realizado até 2010: | R\$ 4.867.272,00 |
| Saldo Financeiro | R\$ 4.479.540,00 | (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) | |
| Créditos aprovados em 2011: | R\$ 4.479.540,00 | Meta Física: | 42,0 % |
| Recursos Disponíveis | R\$ 4.479.540,00 | | |
| Total compromissado | R\$ 0,00 | | |

| | | | |
|---|-----------------|-------------------------|--------------|
| Realizado em 2011: | R\$ 0,00 | Execução Física: | 0,0 % |
| Resultados Alcançados até 2010 | | | |
| Convênio Ferroviário - Pagamento das indenizações cobertas da 1ª a 6ª prestações de contas – Convênio de Apoio Técnico e Financeiro relativo às indenizações de 350 famílias – C-SUPJUR 79/2005 - concluído; | | | |
| Convênio Rodoviário - 1ª e 2ª Prestação de Contas apresentada pela Prefeitura do Rio de Janeiro – 1ª e 2ª medições dos serviços de obras do acesso viário ao Porto do Rio de Janeiro, pela Delta Construções S.A - em andamento. | | | |
| Resultados Alcançados em 2011 | | | |
| Não há realizações no exercício. | | | |
| A Realizar | | | |
| Observação: Aguardando a prestação de contas referente ao convênio de cooperação técnica e financeira C-SUPJUR Nº 036/2006 com a Prefeitura do Rio de Janeiro para o acesso rodoviário. | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 14) Projeto: 26.784.1458.3E72.0033 | | | |
| Ação: Implantação de Balanças no Porto do Rio de Janeiro. | | | |
| Finalidade: Implantação de balanças para controle de carga e pesagem de veículos e/ou mercadorias. | | | |
| Valor do Projeto: | R\$ 515.890,00 | Realizado até 2010: | R\$ 118.597,39 |
| Restos a Pagar | R\$ 103.178,00 | (Decreto s/nº, de 24/06/2011) | |
| Créditos aprovados em 2011: | R\$ 103.178,00 | Meta Física: | 20,0% |
| Recursos Disponíveis | R\$ 0,00 | | |
| Total comprometido | R\$ 0,00 | | |
| Realizado em 2011: | R\$ 0,00 | Execução Física: | 0,0 % |
| Resultados Alcançados até 2010 | | | |
| Pagamento da 1ª a 8ª medições – fornecimento, montagem, instalação e aferição de balanças para controle de carga e pesagem de veículo e mercadoria – SATEC IND E COM LTDA – C-SUPJUR 33/2005 - concluído. | | | |
| Resultados Alcançados em 2011 | | | |
| Não há realizações no exercício. | | | |
| A Realizar | | | |
| Observação: O crédito aprovado para esta ação pelo Decreto s/nº, de 24 de junho de 2011 no valor de R\$ 103.178,00 não apresenta previsão de utilização uma vez que o projeto encontra-se concluído. | | | |

| | | | |
|---|-------------------------|--|-------------------------|
| 15) Projeto: 26.784.1458.3E74.0033 | | | |
| Ação: Ampliação da Rede Elétrica no Porto do Rio de Janeiro (RJ) | | | |
| Finalidade: Ampliar a capacidade e modernizar o sistema de energia elétrica e a iluminação do porto do Rio para atender com qualidade o aumento do consumo interno oriundo dos novos arrendamentos a serem contratados. Nível de iluminação adequado às exigências do ISPS-Code. | | | |
| Valor do Projeto: | R\$ 8.000.000,00 | Realizado até 2010: | R\$ 2.697.968,36 |
| Saldo Financeiro | R\$ 2.594.301,00 | (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) | |
| Saldo Financeiro (Mudança de Fonte) | (R\$ 2.251,621,00) | (Portaria nº 124, de 01/06/2011) | |
| Restos a Pagar | R\$ 2.251.621,00 | (Portaria nº 124, de 01/06/2011) | |
| Restos a Pagar | R\$ 50.000,00 | (Decreto s/nº, de 24/06/2011) | |
| Créditos aprovados em 2011: | R\$ 2.644.301,00 | Meta Física: | 33,0 % |
| Recursos Disponíveis | R\$ 342.680,00 | | |

| | | | |
|--|------------------|-------------------------|--------------|
| Total compromissado | R\$ 2.336.324,28 | | |
| Realizado em 2011: | R\$ 0,00 | Execução Física: | 0,0 % |
| Resultados Alcançados até 2010 | | | |
| Pagamento da 1ª a 11ª medições e reajustamentos referentes à recuperação e modernização do sistema elétrico de média tensão do Porto do Rio de Janeiro – C-SUPJUR 098/2006. | | | |
| Resultados Alcançados em 2011 | | | |
| Não há realizações no exercício. | | | |
| A Realizar | | | |
| Recuperação e Modernização do Sistema Elétrico de Média Tensão do Porto do Rio de Janeiro O contrato C-SUPJUR Nº 098/2006 com ATUAÇÃO ENGENHARIA LTDA está encerrado, porém o processo encontra-se na SUPENG aguardando conclusão. Rede de cabeamento para o sistema de supervisão e monitoramento das subestações elétricas do Porto do Rio de Janeiro O Projeto Básico encontra-se em elaboração. Construção de rede subterrânea de alta tensão no trecho compreendido entre a SUB 17/18 e SE-CS O Projeto Básico encontra-se em elaboração. Contratação dos serviços de construção de rede de dutos de média tensão na área do Cais de São Cristóvão no Porto do Rio de Janeiro A CONCORRÊNCIA Nº 007/2011 está marcada para dia 06/12/2011, conforme Aviso de Licitação publicado no DOU de 01/11/2011. | | | |

16) Projeto: 26.784.1458.3338.0033

Ação: Construção de Terminal de Minério, Gusa e Produtos Siderúrgicos no Porto de Itaguaí (RJ)

Finalidade: Construção de Terminal de Minério do Porto de Itaguaí.

| | | | |
|---|-------------------------|----------------------------|--|
| Valor do Projeto: | R\$ 2.470.563,00 | Realizado até 2010: | R\$ 893.256,35 |
| Saldo Financeiro | | R\$ 37.924,00 | (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) |
| Créditos aprovados em 2011: | | R\$ 37.924,00 | Meta Física: |
| | | | 1,0 % |
| → | | | |
| Recursos Disponíveis | | R\$ 0,00 | |
| Total compromissado | | R\$ 0,00 | |
| Realizado em 2011: | R\$ 0,00 | Execução Física: | 0,0 % |
| Resultados Alcançados até 2010 | | | |
| Pagamento da 1ª a 8ª medições referentes à revitalização e à implementação da iluminação viária no Porto de Itaguaí; Pagamento da 1ª a 3ª medições – Recuperação e pavimentação asfáltica da pista de Itaguaí - contrato 87/2007; Pagamento da 1ª, 2ª e 3ª medições da contratação dos serviços de rede de abastecimento da água do ITAPOR - contrato 26/2008; Pagamento da 1ª e 2ª medições - Alimentação externa do complexo administrativo e portão da Ilha da Madeira do Porto de Itaguaí - contrato nº 070/2008. | | | |
| Serviços de ampliação da rede de drenagem superficial na área do complexo administrativo do Porto de Itaguaí – contrato C-SUPJUR 007/2009 com CONSTRUTORA W.V. LTDA – pagamento da 1ª a 4ª medições e respectivos reajustamentos. | | | |
| Resultados Alcançados em 2011 | | | |
| Não há realizações no exercício. | | | |
| A Realizar | | | |
| Observação: O crédito aprovado para esta ação pela Lei nº 12.381, de 09/02/2011 – LOA/2011 – no valor de R\$ 37.924,00 como Saldo de Exercícios Anteriores está em processo de cancelamento, pois a ação não apresentava saldo financeiro ao final de 2010. | | | |

17) Projeto: 26.784.1458.3341.0033

Ação: Desapropriação para Expansão de Área no Porto de Itaguaí(RJ)

Finalidade: Desapropriação de áreas com a finalidade de salvaguardar o patrimônio da CDRJ, visando à expansão do Porto de Itaguaí.

| | | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------------------|--|
| Valor do Projeto: | R\$ 1.795.000,00 | Realizado até 2010: | R\$ 1.099.250,12 |
| Geração Própria | | R\$ 1.000.000,00 | (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) |

| | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| Créditos aprovados em 2011: | R\$ 1.000.000,00 | Meta Física: | 8.667,0 m² |
| Recursos Disponíveis | R\$ 750.000,00 | | |
| Total compromissado | R\$ 572.641,51 | | |
| Realizado em 2011: | R\$ 572.641,51 | Execução Física: | 4.963,1 m² |
| Resultados Alcançados até 2010 | | | |
| Pagamento de custas judiciais e desapropriações relativas ao Porto de Itaguaí (RJ). | | | |
| Resultados Alcançados em 2011 | | | |
| Pagamento de custas judiciais e desapropriações relativas ao Porto de Itaguaí (RJ). | | | |
| A Realizar | | | |
| Pagamento de custas judiciais e desapropriações relativas ao Porto de Itaguaí (RJ). | | | |

| | | | |
|--|-------------------------|----------------------------|--|
| 18) Projeto: 26.122.0807.4101.0033 | | | |
| Ação: Manutenção e Adequação de Bens Imóveis | | | |
| Finalidade: Realizar despesas com manutenção e obras de adequação que prolonguem a vida útil dos bens imóveis e melhorem a qualidade dos serviços prestados aos usuários. | | | |
| Valor do Projeto: | #ATIVIDADE# | Realizado até 2010: | -- |
| Geração Própria | | R\$ 1.000.000,00 | (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) |
| Créditos aprovados em 2011: | R\$ 1.000.000,00 | Meta Física: | 100,0 % |
| Recursos Disponíveis | R\$ 250.000,00 | | |
| Total compromissado | R\$ 202.389,89 | | |
| Realizado em 2011: | R\$ 0,00 | Execução Física: | 0,0 % |
| Resultados Alcançados em 2011 | | | |
| Não há realizações no exercício. | | | |
| A Realizar | | | |
| Contratação de empresa de engenharia especializada para a prestação de serviços de "REMODELAGEM DO PRÉDIO SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE ITAGUAÍ" | | | |
| A CONCORRÊNCIA Nº 006/2011 está marcada para dia 04/01/2012, conforme Aviso de Licitação publicado no DOU de 23/11/2011. | | | |

| | | | |
|---|-------------------------|----------------------------|--|
| 19) Projeto: 26.122.0807.4102.0033 | | | |
| Ação: Manutenção adequação bens móveis, veículos, máquinas e equipamentos | | | |
| Finalidade: Realizar despesas com manutenção e obras de adequação que prolonguem a vida útil dos bens móveis, veículos, máquinas e equipamentos proporcionando melhor qualidade dos serviços prestados aos usuários. | | | |
| Valor do Projeto: | #ATIVIDADE# | Realizado até 2010: | -- |
| Geração Própria | | R\$ 1.000.000,00 | (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) |
| Créditos aprovados em 2011: | R\$ 1.000.000,00 | Meta Física: | 100,0 % |
| Recursos Disponíveis | R\$ 750.000,00 | | |
| Total compromissado | R\$ 602.330,86 | | |
| Realizado em 2011: | R\$ 516.678,36 | Execução Física: | 51,7 % |
| Resultados Alcançados em 2011 | | | |
| 1-Aquisição de aparelhos de ar-condicionado, conforme O.F 80/2010: CLIMA RIO 2004 COM. E SERV. DE REFRIGERAÇÃO LTDA. | | | |
| 2-Aquisição de poltronas para auditório, conforme O.F 65/2010. Pagamento da NF Nº14154: GIROFLEX S/A. | | | |

- 3-Aquisição de sofás e poltrona, conforme O.F 87/2010. Pagamento da NF N° 7284: AURUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA.
- 4-Aquisição de estante de aço, conforme O.F 02/2011. Pagamento de NF N° 596: METALURGICA PROAÇO LTDA.
- 5-Aquisição e instalação de 02(dois) aparelhos de ar-condicionado, conforme O.F 80/2010: CLIMARIO 2004 COM. E SERV. DE REFRIGERAÇÃO LTDA.
- 6-Aquisição e instalação de 03(três) aparelhos de ar-condicionado, conforme O.F 80/2010: CLIMARIO 2004 COM. E SERV. DE REFRIGERAÇÃO LTDA.
- 7-Aquisição de 16(dezesseis) aparelhos Springer eletrônicos de ar-condicionado de 10.000, 21.000 e 30.000 BTUS, conforme O.F 16/2011: ARTICO COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA.
- 8-Aquisição de 23(vinte e três) refrigeradores CONSUL frost free de 01 porta, conforme O.F 25/2011: CHAVES COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA.
- 9-Aquisição de 02 cafeteiras industriais, conforme O.F 25/2011: CHAVES COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA
- 10-Aquisição de 08 unidades evaporadoras e 08 condensadoras CARRIER de 12.000 e 18.000 Btus, conforme O.F. 015/2010 e 015/2011: CLIMARIO 2004 COM. E SERV. DE REFRIGERAÇÃO LTDA
- 11-Aquisição de 10 unidades evaporadoras + 10 condensadoras de 30.000 btus + 10 kits, conforme O.F. 015/2010 e 015/2011: CLIMARIO 2004 COM. E SERV. DE REFRIGERAÇÃO LTDA.
- 12-Aquisição de estante de aço carbono com 06(seis) prateleiras, conforme O.F 033/2011: METALÚRGICA PROAÇO LTDA.
- 13-Aquisição de 03(três) fornos de micro-ondas BRASTEMP 38 LTS, conforme O.F 027/2011: HCR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
- 14-Aquisição de frigobar e cafeteira industrial, conforme O.F 026/2011: TREVISÓ COMÉRCIO DE ALIMENTOS.
- 15-Aquisição de 06(seis) câmeras fotográficas digitais SONY W350, conforme O.F 032/2011: NADJA MARINA PIRES ME.
- 16-Aquisição de 01(um) quadro branco com moldura de alumínio medindo 1,20 x 0,90 cm, conforme O.F 038/2011: COMERCIAL SUDESTE RJ LTDA.
- 17-Aquisição de 02(duas) TVs LCD 46": PAULA DOS SANTOS MARCOLIN - ME.
- 18-Aquisição de 05(cinco) unidades evaporadoras + 05(cinco) condensadoras de 30.000 BTUs + 05(cinco) kits, conforme O.F 015/2010 e 015/2011: CLIMARIO 2004 COM. E SERV. DE REFRIGERAÇÃO LTDA.
- 19-Aquisição de 02(dois) suportes de teto para televisão de 46": LUIZ FABIANO APONTE – ME.
- 20-Aquisição de 01(um) medidor de condutividade, temperatura/pressão para SUPMAM, conforme O.F. 047/2010: FM & TECNOLOGIA LTDA.

20) Projeto: 26.126.0807.4103.0033

Ação: Manutenção e Adequação Ativos Informática e Teleprocessamento

Finalidade: Realizar despesas com manutenção, adequação e aquisição de bens nas áreas de informática, informação e teleprocessamento que prolonguem a vida útil dos ativos de informática nas respectivas áreas e propiciem melhor qualidade dos serviços prestados aos usuários.

| Valor do Projeto: | #ATIVIDADE# | Realizado até 2010: | -- |
|------------------------------------|-------------|-------------------------|--|
| Geração Própria | | R\$ 1.000.000,00 | (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) |
| Créditos aprovados em 2011: | | R\$ 1.000.000,00 | Meta Física: 100,0 % |
| Recursos Disponíveis | | R\$ 800.000,00 | |
| Total compromissado | | R\$ 766.852,68 | |
| Realizado em 2011: | | R\$ 607.368,82 | Execução Física: 60,7 % |

Resultados Alcançados em 2011

- 1-Aquisição de uma impressora de cheque da marca Elgin para DIGEFI, conforme O.F 23/2011: DECISIVA EQUIPAMENTOS PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.
- 2-Aquisição de 02 projetores multimídia, conforme O.F 22/2011: C. CRISTINA LEÃO REGO INFORMÁTICA.
- 3-Aquisição de 50 microcomputadores da marca LENOVO, conforme O.F 24/2011: SAFE SYSTEM INFORMÁTICA S/A.
- 4-Aquisição de materiais de informática, conforme O.F. 034/2011: TELTEC NETWORKS LTDA.
- 5-Prestação de serviços de instalação de sistemas integrado de segurança, de acesso de pessoas, CFTV e frequência de pessoal, contrato C-SUPJUR 016/2011 com IB TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.

21) Projeto: 26.784.1458.6504.0033

Ação: Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio Ambiente

Finalidade: Proceder a estudos de viabilidade técnica, comercial e ambiental para subsidiar os projetos de aprofundamento dos Portos e os arrendamentos de áreas.

| Valor do Projeto: | #ATIVIDADE# | Realizado até 2010: | R\$ 2.844.058,00 |
|-------------------|-------------|---------------------|------------------|
|-------------------|-------------|---------------------|------------------|

| | | | |
|--|-------------------------|--|------------------|
| Orçamento Fiscal / 2011 | R\$ 4.100.000,00 | (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) | |
| Saldo Financeiro | R\$ 3.767.876,00 | (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) | |
| Saldo Financeiro (Mudança de Fonte) | (R\$ 3.257.920,00) | (Portaria nº 124, de 01/06/2011) | |
| Restos a Pagar | R\$ 3.257.920,00 | (Portaria nº 124, de 01/06/2011) | |
| Créditos aprovados em 2011: | R\$ 7.867.876,00 | Meta Física: | 38,0 unid |
| Recursos Disponíveis | R\$ 1.767.876,32 | | |
| Total comprometido | R\$ 0,00 | | |
| Realizado em 2011: | R\$ 0,00 | Execução Física: | 0,0 unid |
| Resultados Alcançados até 2010 | | | |
| Pagamento referente a estudos geotécnicos no canal de acesso ao porto de Itaguaí; Pagamento das parcelas do convênio C-SUPJUR 108/2006 com o CENTRAN – Ministério da Defesa. | | | |
| Resultados Alcançados em 2011 | | | |
| Não há realizações no exercício. | | | |
| A Realizar | | | |
| Consultoria com foco na Análise e Desenvolvimento de Projetos Básicos e Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) de empreendimentos portuários O processo foi encaminhado para análise da SUPJUR. | | | |
| Consultoria com foco na Análise e Avaliação dos Ativos Imobiliários da CDRJ O Termo de Referência está em elaboração pela DIMACO. | | | |

22) Projeto: 26.784.1458.7376.0033

Ação: Dragagem de Aprofundamento Canal de Acesso e Bacia de Evolução do Porto de Itaguaí (RJ)

Finalidade: Alargar trecho do canal de acesso com 150 metros de largura e aprofundar o calado para 20 metros, decorrentes da demanda crescente de cargas ao porto, tais como: minério, carvão, soja e contêineres.

| | | | |
|------------------------------------|---------------------------|--|---------------------------|
| Valor do Projeto: | R\$ 380.733.300,00 | Realizado até 2010: | R\$ 104.551.702,03 |
| Saldo Financeiro | R\$ 1.896.300,00 | (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) | |
| Créditos aprovados em 2011: | R\$ 1.896.300,00 | Meta Física: | 1,0 mil m³ |
| Recursos Disponíveis | R\$ 1.448.298,00 | | |
| Total comprometido | R\$ 292.989,00 | | |
| Realizado em 2011: | R\$ 292.989,00 | Execução Física: | 0,2 mil m³ |

Resultados Alcançados até 2010

Pagamento da 1ª a 10ª medições e respectivos reajustes do contrato com a firma Bandeirantes – dragagem de infraestrutura aquaviário de acesso ao Porto de Itaguaí – DEPJUR 18/2000; Pagamento da 1ª a 10ª medições do contrato com a firma Ster Engenharia Ltda – Dragagem do acesso aquaviário do Porto de Itaguaí – C-SUPJUR 035/2008.

Serviços de caracterização morfo-acústica do corpo rochoso existente no canal de acesso ao Porto de Itaguaí – contrato C-SUPJUR 028/2010 com MICROARS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA – pagamento da 1ª a 3ª medições.

Serviços de sondagens subaquáticas por jet-probe na área de influência do corpo rochoso existente no canal de acesso ao Porto de Itaguaí - contrato C-SUPJUR 041/2010 com HIDROTOPO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA – pagamento da medição única.

Resultados Alcançados em 2011

Consultoria e estudos ambientais para dragagem de áreas de fundeio no acesso aquaviário ao Porto de Itaguaí (RJ)

O contrato C-SUPJUR Nº 020/2011 com PH MAR CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA está em execução – pagamento da 1ª a 4ª medições.



A Realizar

Caracterização geológico-geotécnica do corpo rochoso existente no canal de acesso ao Porto de Itaguaí (RJ)

O processo aguarda definição quanto a viabilidade de sua execução.

| | | | |
|--|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 23) Projeto: 26.784.1458.7390.0033 | | | |
| Ação: Implantação do Sistema de Sinalização Náutica do Porto de Itaguaí | | | |
| Finalidade: Implantação de sinalização náutica de alto desempenho e durabilidade para a segurança da navegação nos canais e bacias de evolução do acesso aquaviário do Porto de Itaguaí, em cumprimento aos ditames da Lei 8630/93. | | | |
| Valor do Projeto: | R\$ 4.000.000,00 | Realizado até 2010: | R\$ 1.240.000,00 |
| Restos a Pagar | | R\$ 1.760.000,00 | (Decreto s/nº, de 24/06/2011) |
| Créditos aprovados em 2011: | | R\$ 1.760.000,00 | Meta Física: 13,0% |
| Recursos Disponíveis | | R\$ 0,00 | |
| Total compromissado | | R\$ 0,00 | |
| Realizado em 2011: | | R\$ 0,00 | Execução Física: 0,0% |
| Resultados Alcançados até 2010 | | | |
| Fornecimento de equipamentos de sinalização náutica para o Porto de Itaguaí. | | | |
| Resultados Alcançados em 2011 | | | |
| Não há realizações no exercício. | | | |
| A Realizar | | | |
| Aquisição de acessórios dos sinais flutuantes e faróis para o sistema de balizamento náutico NORMAM 17 Marinha do Brasil O Projeto Básico encontra-se em elaboração. | | | |

| | | | |
|---|-------------------------|----------------------------|--|
| 24) Projeto: 26.784.1458.7412.0033 | | | |
| Ação: Obras de Demarcação e Proteção das Áreas do Porto de Itaguaí (RJ) | | | |
| Finalidade: Limitar, cercar e proteger os limites da área do Porto Organizado de Itaguaí. | | | |
| Valor do Projeto: | R\$ 2.133.000,00 | Realizado até 2010: | R\$ 0,00 |
| Saldo Financeiro | | R\$ 2.133.000,00 | (Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011) |
| Saldo Financeiro (Mudança de Fonte) | | (R\$ 2.133.000,00) | (Portaria nº 124, de 01/06/2011) |
| Restos a Pagar | | R\$ 2.133.000,00 | (Portaria nº 124, de 01/06/2011) |
| Créditos aprovados em 2011: | | R\$ 2.133.000,00 | Meta Física: 100,0 % |
| Recursos Disponíveis | | R\$ 0,00 | |
| Total compromissado | | R\$ 0,00 | |
| Realizado em 2011: | | R\$ 0,00 | Execução Física: 0,0 % |
| Resultados Alcançados até 2010 | | | |
| Não há realizações no período. | | | |
| Resultados Alcançados em 2011 | | | |
| Não há realizações no exercício. | | | |
| A Realizar | | | |
| Fornecimento e instalação de cercas para proteção de áreas no Porto de Itaguaí (RJ) O Projeto Básico encontra-se em elaboração. | | | |

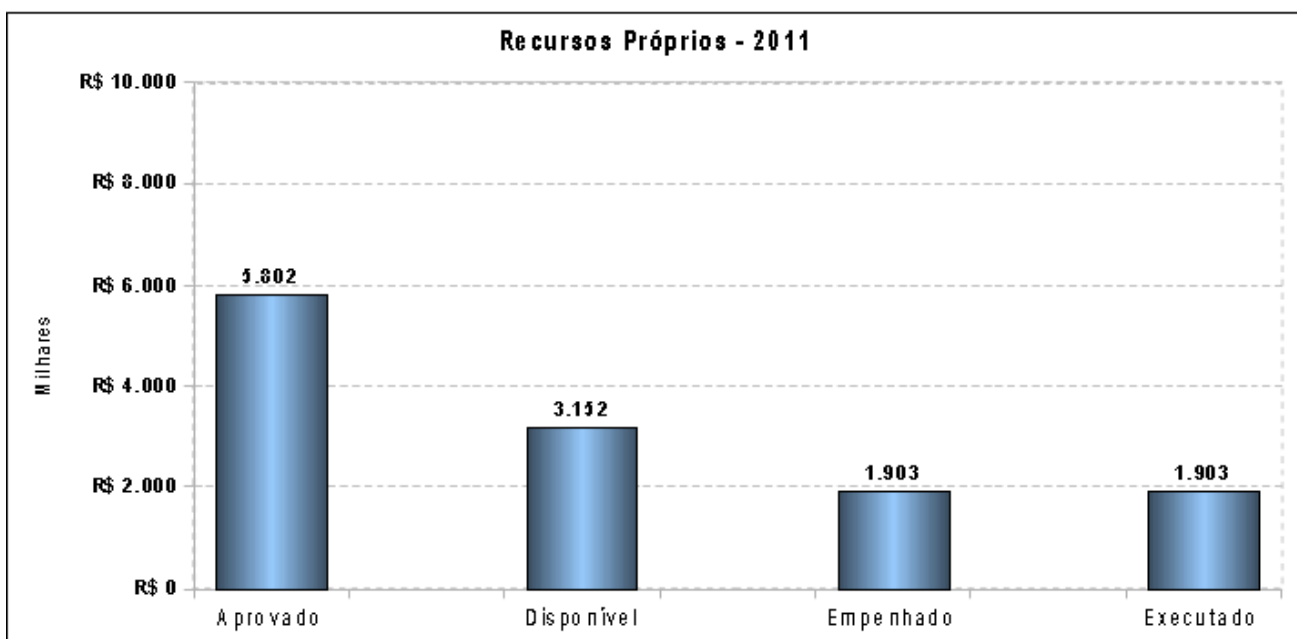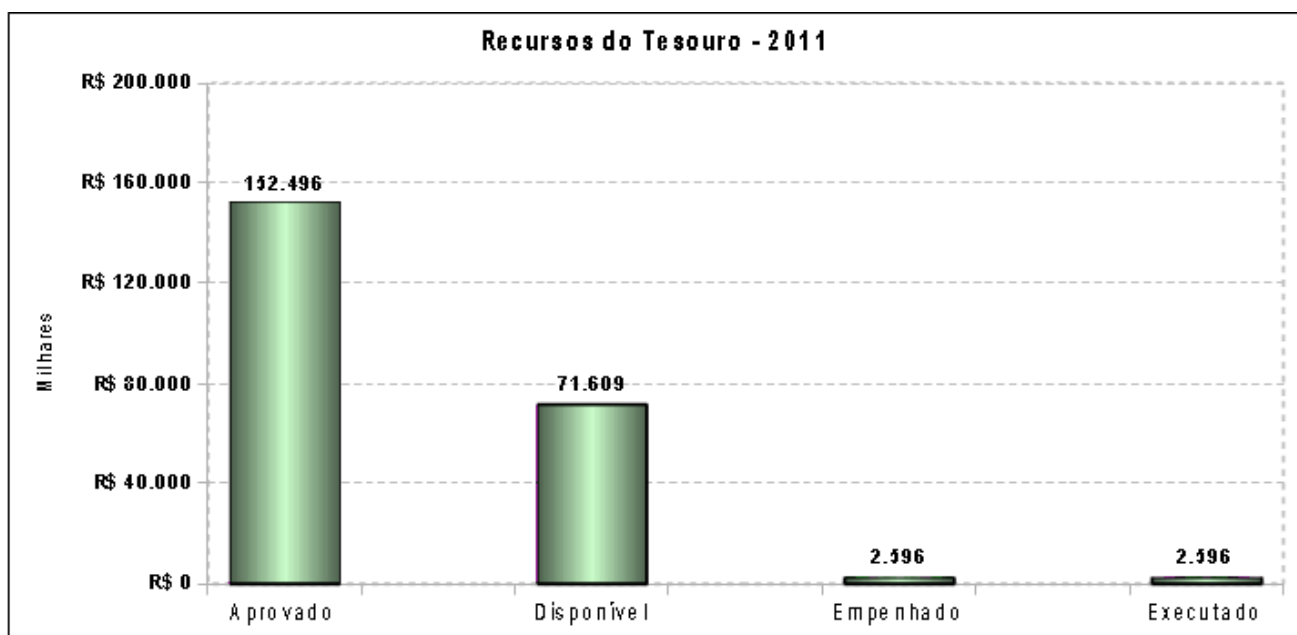

ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

(agrupado por fonte de recursos)

Outubro / 2011

R\$ 1,00

| TOTAL POR FONTE DE RECURSO | | Lei + Créditos | Compromissado | Disponível | Empenhado | Realizado |
|----------------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| FONTE: | RECURSOS PRÓPRIOS | 5.802.000,00 | 3.911.658,59 | 3.151.620,17 | 1.903.088,73 | 1.903.088,73 |
| FONTE: | RECURSOS TESOUREIRO | 152.496.064,00 | 25.547.426,03 | 71.609.131,96 | 2.596.462,80 | 2.596.462,80 |
| TOTAL GERAL | | 158.298.064,00 | 29.459.084,62 | 74.760.752,13 | 4.499.551,53 | 4.499.551,53 |
