

Anexo II

Acompanhamento do

Orçamento de

Investimentos 2011

1. Quanto ao prazo de fechamento mensal

O art. 3º do Decreto nº 3735, de 24 de janeiro de 2001, determinou que a inserção dos dados referentes ao Orçamento de Investimentos, deverá ser feito até o dia 20 do mês subsequente ao de referência, no Sistema Integrado das Empresas Estatais - SIEST.

2. Valores aprovados em 2011

Base Legal	Suplementação	Cancelamento	Total Aprovado
Decreto s/nº, de 28/01/2011	R\$ 31.000.000	R\$ 0	R\$ 31.000.000
Lei nº 12.381, de 09/02/2011 (LOA/2011)	R\$ 124.148.499	R\$ 0	R\$ 124.148.499
Portaria nº 124, de 01/06/2011	R\$ 12.914.605	(R\$ 12.914.605)	R\$ 0
Decreto s/nº, de 24/06/2011	R\$ 3.149.565	R\$ 0	R\$ 3.149.565
TOTAL	R\$ 171.212.669	(R\$ 12.914.605)	R\$ 158.298.064

3. Valores realizados em 2011

No exercício foram realizados **0,8%** do total aprovado, perfazendo um montante de **R\$ 1.337.688,79**.

ACÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

1) Projeto: 26.784.1458.10VS.0033			
Ação: Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS-CODE) no Porto de Itaguaí (RJ)			
Finalidade: Dotar as instalações portuárias do Porto de Itaguaí de condições de segurança e prevenção à ameaça de ataques terroristas e outros ilícitos que comprometam sua atividade.			
Valor do Projeto:	R\$ 22.422.668,00	Realizado até 2010:	R\$ 9.009.651,01
Saldo Financeiro		R\$ 7.567.131,00	(Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011)
Saldo Financeiro (Mudança de Fonte)		(R\$ 3.000.000,00)	(Portaria nº 124, de 01/06/2011)
Restos a Pagar		R\$ 3.000.000,00	(Portaria nº 124, de 01/06/2011)
Créditos aprovados em 2011:		R\$ 7.567.131,00	Meta Física: 47,0 %
Recursos Disponíveis		R\$ 1.803.863,00	
Total compromissado		R\$ 1.803.863,00	
Realizado em 2011:	R\$ 521.972,68	Execução Física:	3,2%
Resultados Alcançados até 2010			
<p>Instalação e fornecimento de equipamentos para implantação do Sistema Integrado de Segurança (SIS) – contrato 107/2005; Obras de reforma do prédio da SUPGUA no ITAPOR – contrato 109/2005; Aquisição de micro-ônibus para a SUPGUA no ITAPOR – contrato 105/2005; aquisição de boias de sinalização náutica para o canal de acesso do Porto de Itaguaí; construção de cercas para casas de transferências de energia; Pagamento da 1ª a 9ª medições da Siemens, referente à implantação do SIS-ITAPOR; Aquisição de grupo gerador para a superintendência da guarda portuária; Obra de fechamento das guaritas do ITAPOR; Construção de muro fronteiro do Vilar de Coqueiros; Logon Construções e Consultoria Técnica em Engenharia Ltda – 2ª e 3ª medições referentes à adequação das instalações de acesso do Porto de Itaguaí – ISPS-CODE; Aquisição de 30.000 cartões de identificação – O.F 040/2008. Pagamento da 1ª a 5ª medições do contrato 037/2009 com a Construtora W.V. LTDA, referente à ampliação da portaria principal do Porto de Itaguaí; Construtora W.V. LTDA – Termo de rescisão amigável 069/2009 referente ao contrato 027/2008.</p> <p>Ampliação da Portaria Principal do Porto de Itaguaí – contrato C-SUPJUR 037/2009 com a Construtora W.V. LTDA – pagamento da 6ª a 13ª medições e reajustamentos da 12ª e 13ª medições.</p> <p>Complementação do balizamento do canal de acesso ao Porto de Itaguaí – contrato C-SUPJUR 059/2010 com RIO INTERPORT CONSULT. ENGENHARIA LTDA – pagamento da 1ª medição.</p>			
Resultados Alcançados em 2011			
Complementação do balizamento do canal de acesso ao Porto de Itaguaí – contrato C-SUPJUR 059/2010 com RIO INTERPORT CONSULT. ENGENHARIA LTDA – pagamento da 2ª medição.			
Pavimentação da portaria principal do Porto de Itaguaí (RJ) – contrato C-SUPJUR 18/2011 com CONSTRUTORA W.V. LTDA – pagamento da 1ª medição.			
A Realizar			
Ampliação da Portaria Principal do Porto de Itaguaí – contrato C-SUPJUR 037/2009 em execução em 2010.			
Serviços de recuperação e melhorias do Sistema Integrado de Segurança do Porto de Itaguaí (RJ) – em fase de procedimento licitatório.			

2) Projeto: 26.784.1458.10VW.0033			
Ação: Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS-CODE) no Porto do Rio de Janeiro (RJ)			
Finalidade: Dotar as instalações portuárias do Porto do Rio de Janeiro de condições de segurança e prevenção à ameaça de ataques terroristas e outros ilícitos que comprometam sua atividade.			
Valor do Projeto:	R\$ 28.558.431,00	Realizado até 2010:	R\$ 11.308.252,07
Saldo Financeiro		R\$ 9.307.592,00	(Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011)
Saldo Financeiro (Mudança de Fonte)		(R\$ 3.000.000,00)	(Portaria nº 124, de 01/06/2011)
Restos a Pagar		R\$ 3.000.000,00	(Portaria nº 124, de 01/06/2011)
Restos a Pagar		R\$ 1.236.387,00	(Decreto s/nº, de 24/06/2011)
Créditos aprovados em 2011:	R\$ 10.543.979,00	Meta Física:	40,0 %
Recursos Disponíveis	R\$ 7.543.979,00		
Total compromissado	R\$ 1.655.332,18		
Realizado em 2011:	R\$ 30.711,00	Execução Física:	0,1%
Resultados Alcançados até 2010			
<p>Aquisição de 170 pistolas marca TAURUS calibre 38 e munições; aquisição de 30 aparelhos de ar condicionado para a SUPGUA; Obras de adaptação do prédio da guarda, custas cartônicas e lavratura de três procurações – contrato 016/2006; aquisição de sistema de controle de acesso e de segurança aos portos do RJ; serviço de assessoria técnica na implantação do ISPS-CODE nos portos do RJ; aquisição de seis veículos do tipo pick-up cabine dupla; aquisição de binóculos para visão noturna; aquisição de 12 bancos tipo longarina, sendo 9 de 3 lugares e 3 de 5 lugares; aquisição de doze rádio comunicadores; aquisição de um aparelho de TV de 29" e um vídeo cassete de 7 cabeças; aquisição de 50 cadeiras tipo secretária; aquisição de 3 cadeiras tipo diretor espaldar alto, 4 cadeiras tipo diretor espaldar médio, 20 cadeiras tipo chefia, 12 mesas tipo chefia, 1 mesa redonda para reunião e 50 poltronas de auditório com prancheta; aquisição de 2 armários de aço; aquisição de seis aparelhos de faxes à laser com copiadora e identificador de chamadas; aquisição de software de identificação para a SUPGUA; aquisição de seis motos para SUPGUA; aquisição de material de informática; projeto de adaptação do prédio da SUPGUA para o ISPS-CODE; aquisição de máquina fragmentadora de papel; aquisição de no-break; implantação do ISPS-CODE nos portos do RJ e Itaguaí; aquisição de armários de aço; aquisição de câmera qeb para SUPGUA; aquisição de máquina fotográfica e filmadora; aquisição de impressora de etiquetas; aquisição de equipamentos de ginástica; aquisição de mesas e armários; aquisição de 19 bebedouros; aquisição de microcomputadores; contratação dos serviços de pavimentação asfáltica e infraestrutura de iluminação no Porto do RJ – Constr WV Ltda; construção, reforma e adaptação das portarias do Porto do RJ firmado coma Giver Engenharia Ltda – contrato 108/2005; aquisição de bóias de sinalização náutica para os portos do Rio e Niterói; aquisição de 21 conjuntos de defensas, visando a segurança de embarcações e instalações portuárias; Implantação da sinalização horizontal de áreas adjacentes ao RIOPOR; obras de fechamento de guaritas; Implantação de bóias de sinalização náutica no RIOPOR; serviços de podas de árvores no Porto do Rio; Projeto para integração de sistemas de segurança portuária e aduaneira; Projeto executivo da nova sede da SUPGUA para atendimento ao ISPS-CODE; Projeto de engenharia do VTS-Monitoramento do tráfego marítimo; Pagamento das 1ª a 9ª medições da Siemens, referente a implantação do Sistema Integrado de Segurança - SIS-RIOPOR; Despesas com projeto do sistema de iluminação no RIOPOR; Aquisição de 4 Bastões Anti-tumulto; Pagamento da 2ª parcela de cartões de aproximação; Pagamento da 3ª medição do projeto de monitoramento das embarcações dentro das áreas do Porto Organizado; Aquisição de grupo gerador para a superintendência da guarda portuária; Pagamento da 1ª medição do Sistema de GIS, do RIOPOR; Pagamento da 1ª e 2ª medições do contrato 086/2009 com a Hansalufbild Geo Informações Ltda, referente ao Projeto de implantação de um sistema de informações geo referenciais; Pagamento referente ao 1º termo aditivo do contrato 086/2009. Construção da Sede da Guarda Portuária – contrato C-SUPJUR 027/2010 com MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS S/A – pagamento da 1ª a 3ª medições.</p> <p>Fornecimento e instalação de proteção e segurança para o armazém 15 do porto do Rio de Janeiro – contrato C-SUPJUR 068/2010 com NOVA QUADRANTE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA – pagamento da medição única.</p>			
Resultados Alcançados em 2011			
Implantação de dispositivos de segurança para acesso de pedestres no portão 24 do Porto do Rio de Janeiro – contrato C-SUPJUR 098/2010 com TRAFEG SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DE TRANSITO LTDA – pagamento da 1ª medição.			
A Realizar			
Construção da Sede da Guarda Portuária – a obra está sem licença da Prefeitura (RJ).			
Serviços de Recuperação e Melhorias do Sistema Integrado de Segurança do Porto do Rio de Janeiro – em fase de procedimento licitatório.			

3) Projeto: 26.784.1458.100Y.0033			
Ação: Recuperação da Pavimentação das Vias Internas do Porto do Rio de Janeiro (RJ)			
Finalidade: Promover a drenagem de águas pluviais e recuperação da pavimentação a fim de evitar a formação de poças, melhorando a segurança no trânsito de veículos rodoviários e ferroviários.			
Valor do Projeto:	R\$ 2.900.000,00	Realizado até 2010:	R\$ 699.275,00
Geração Própria		R\$ 1.300.000,00	(Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011)
Créditos aprovados em 2011:		R\$ 1.300.000,00	Meta Física: 45,0 %
Recursos Disponíveis		R\$ 325.000,00	
Total compromissado		R\$ 1.655.332,18	
Realizado em 2011:	R\$ 0,00	Execução Física:	0,0 %
Resultados Alcançados até 2010			
Pagamento da 1ª a 6ª medições do contrato C-SUPJUR 117/08 – Recuperação da pavimentação de áreas internas do Porto do Rio de Janeiro.			
Resultados Alcançados em 2011			
Não há realizações no exercício.			
A Realizar			
Recuperação da pavimentação das vias internas do Porto do Rio de Janeiro - em fase de elaboração do Edital.			
4) Projeto: 26.784.1458.11HG.0033			
Ação: Implantação do Sistema de Defensas no Porto do Rio de Janeiro (RJ)			
Finalidade: Destina-se a dotar o Porto do Rio de Janeiro de melhores condições para atracação dos navios e proteção do paramento do cais em conformidade com a Lei 8.630/93.			
Valor do Projeto:	R\$ 10.000.000,00	Realizado até 2010:	R\$ 9.842.046,00
Orçamento Fiscal / 2011		R\$ 1.358.000,00	(Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011)
Saldo Financeiro		R\$ 1.708.476,00	(Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011)
Créditos aprovados em 2011:		R\$ 3.066.476,00	Meta Física: 31,0%
Recursos Disponíveis		R\$ 0,00	
Total compromissado		R\$ 0,00	
Realizado em 2011:	R\$ 0,00	Execução Física:	0,0 %
Resultados Alcançados até 2010			
Pagamento da 1ª a 7ª medições do contrato 023/2006 referente à fabricação, transporte e montagem de defensas no Porto do Rio de Janeiro, firmado com a Ponta Leste Angra Atividades Subaquáticas. Fornecimento e instalação de defensas para o Porto do Rio de Janeiro – contrato C-SUPJUR 099/2009 com COPABO INFRAESTRUTURA MARÍTIMA LTDA – pagamento da 1ª a 12ª medições.			
Resultados Alcançados em 2011			
Não há realizações no exercício.			
A Realizar			
Aquisição das primeiras defensas sobressalentes - em fase de elaboração do Edital.			

5) Projeto: 26.784.1458.12IE.0033			
Ação: Recuperação do Sistema Viário Interno do Porto de Itaguaí (RJ)			
Finalidade: Pavimentação asfáltica da pista de acesso interno ao portão da Ilha da Madeira do Porto de Itaguaí.			
Valor do Projeto:	R\$ 9.500.000,00	Realizado até 2010:	R\$ 3.318.477,93
Saldo Financeiro		R\$ 985.436,00	(Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011)
Saldo Financeiro (Mudança de Fonte)		(R\$ 508.451,00)	(Portaria nº 124, de 01/06/2011)
Restos a Pagar		R\$ 508.451,00	(Portaria nº 124, de 01/06/2011)
Créditos aprovados em 2011:		R\$ 985.436,00	Meta Física: 10,0 %
Recursos Disponíveis		R\$ 0,00	
Total compromissado		R\$ 0,00	
Realizado em 2011:		R\$ 0,00	Execução Física: 0,0 %
Resultados Alcançados até 2010			
Serviços de recuperação e implantação da pavimentação asfáltica na pista interna de acesso à Ilha da Madeira no Porto de Itaguaí. Pavimentação da pista 500 do Porto de Itaguaí – contrato C-SUPJUR 106/2009 com CONSTRUTORA W.V. LTDA – pagamento da 1ª a 4ª medições, respectivos reajustamentos e 1º Termo Aditivo. Pavimentação da pista 200 do Porto de Itaguaí – contrato C-SUPJUR 051/2010 com CONSTRUTORA W.V. LTDA – pagamento da 1ª e 2ª medições.			
Resultados Alcançados em 2011			
Não há realizações no exercício.			
A Realizar			
Construção de dois acostamentos da Pista 200 entre a portaria principal e o viaduto – em fase de elaboração do Edital.			

6) Projeto: 26.784.1458.12IG.0033			
Ação: Implantação do Centro Avançado de Controle de Tráfego do Porto de Itaguaí			
Finalidade: Criação de Truck Center para desenvolver as atividades de obtenção de permissões de acesso junto à Guarda Portuária, vistoria das carretas, pesagem e apoio logístico para os caminhoneiros.			
Valor do Projeto:	R\$ 12.500.000,00	Realizado até 2010:	R\$ 0,00
Orçamento Fiscal / 2011		R\$ 7.000.000,00	(Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011)
Saldo Financeiro		R\$ 3.033.923,00	(Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011)
Créditos aprovados em 2011:		R\$ 10.033.923,00	Meta Física: 80,0 %
Recursos Disponíveis		R\$ 3.032.923,00	
Total compromissado		R\$ 0,00	
Realizado em 2011:		R\$ 0,00	Execução Física: 0,0 %
Resultados Alcançados até 2010			
Não há realizações no período.			
Resultados Alcançados em 2011			
Não há realizações no exercício.			
A Realizar			
A ação encontra-se com o Projeto Básico concluído com valor inicial de R\$ 6.918.708,20 a preço de 2006. Atualmente, está em fase de atualização de preços e elaboração das especificações técnicas para conclusão do Edital.			

7) Projeto: 26.784.1458.12II.0033			
Ação: Complementação das Obras do Complexo Administrativo Portuário no Porto de Itaguaí (RJ)			
Finalidade: Dotar o porto de instalações de atendimento adequadas aos usuários que demandam pelos Órgãos Intervenientes e Administração do Porto, evitando conflito no fluxo de pedestres, equipamentos portuários e veículos que circulam na via lindeira ao porto.			
Valor do Projeto:	R\$ 600.000,00	Realizado até 2010:	R\$ 0,00
Orçamento Fiscal / 2011	R\$ 600.000,00	(Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011)	
Créditos aprovados em 2011:	R\$ 600.000,00	Meta Física:	100,0 %
Recursos Disponíveis	R\$ 0,00		
Total compromissado	R\$ 0,00		
Realizado em 2011:	R\$ 0,00	Execução Física:	0,0 %
Resultados Alcançados até 2010			
Não há realizações no período.			
Resultados Alcançados em 2011			
Não há realizações no exercício.			
A Realizar			
Obras Complementares do Prédio do Complexo Administrativo Portuário do Porto de Itaguaí (RJ) – a licitação está concluída. Aguardando recursos financeiros para assinatura do contrato.			

8) Projeto: 26.784.1458.12LG.0033			
Ação: Reforço Estrutural do Cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro (RJ)			
Finalidade: Possibilitar o Porto do Rio de Janeiro de reforço estrutural nas instalações do Cais da Gamboa, para recebimento de navios de calado de -13,5m, a fim de atender a crescente demanda de exportação em navegação de longo curso.			
Valor do Projeto:	R\$ 120.000.000,00	Realizado até 2010:	R\$ 0,00
Orçamento Fiscal / 2011	R\$ 120.000.000,00	(Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011)	
Créditos aprovados em 2011:	R\$ 12.000.000,00	Meta Física:	25,0 %
Recursos Disponíveis	R\$ 0,00		
Total compromissado	R\$ 0,00		
Realizado em 2011:	R\$ 0,00	Execução Física:	0,0 %
Resultados Alcançados até 2010			
Não há realizações no período.			
Resultados Alcançados em 2011			
Não há realizações no exercício.			
A Realizar			
A ação encontra-se com o Projeto Básico concluído.			

9) Projeto: 26.784.1458.12LI.0033			
Ação: Reforço Estrutural do Cais de São Cristóvão no Porto do Rio de Janeiro (RJ)			
Finalidade: Efetuar o reforço estrutural do Cais de São Cristóvão, no Porto do Rio de Janeiro, para o recebimento de navios de calado até -13,5m, a fim de atender a crescente demanda de exportação e navegação de longo curso.			
Valor do Projeto:	R\$ 80.000.000,00	Realizado até 2010:	R\$ 0,00
Orçamento Fiscal / 2011		R\$ 8.000.000,00	(Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011)
Créditos aprovados em 2011:		R\$ 8.000.000,00	Meta Física: 37,0%
Recursos Disponíveis		R\$ 0,00	
Total compromissado		R\$ 0,00	
Realizado em 2011:		R\$ 0,00	Execução Física: 0,0 %
Resultados Alcançados até 2010			
Não há realizações no período.			
Resultados Alcançados em 2011			
Não há realizações no exercício.			
A Realizar			
A ação está aguardando novas definições.			

10) Projeto: 26.784.1458.12LI.0033			
Ação: Implantação de 3 Píeres de Atracação no Porto do Rio de Janeiro (RJ)			
Finalidade: Atender à demanda do turismo marítimo, melhorando a qualidade do atendimento ao embarque e desembarque de passageiros e tripulantes e atracação de navios.			
Valor do Projeto:	R\$ 314.000.000,00	Realizado até 2010:	R\$ 0,00
Orçamento Fiscal / 2011		R\$ 47.000.000,00	(Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011)
Restos a Pagar		R\$ 31.000.000,00	(Decreto s/nº, de 28/01/2011)
Créditos aprovados em 2011:		R\$ 78.000.000,00	Meta Física: 26,0 %
Recursos Disponíveis		R\$ 0,00	
Total compromissado		R\$ 2.859.007,79	
Realizado em 2011:		R\$ 0,00	Execução Física: 0,0 %
Resultados Alcançados até 2010			
Não há realizações no período.			
Resultados Alcançados em 2011			
Não há realizações no exercício.			
A Realizar			
Contratação dos serviços de engenharia consultiva para gerenciamento e fiscalização das obras de adequação do terminal de passageiros do Porto do Rio de Janeiro – em fase de elaboração do Edital. Contratação dos Serviços de Execução de Sondagens Geotécnicas Mistas no Porto do Rio de Janeiro – contrato C-SUPJUR 034/2011 com GEODRILL ENGENHARIA LTDA – assinado em 30/05/2011.			

11) Projeto: 26.784.1458.131E.0033			
Ação: Modernização de Elevadores da Sede da CDRJ e do Porto do Rio de Janeiro.			
Finalidade: Modernizar o sistema de comando e controle dos elevadores instalados no Edifício Sede da CDRJ e dos elevadores instalados no Porto do Rio de Janeiro, substituindo os painéis de comando a relé, através da instalação de painéis eletrônicos capazes de oferecer ao usuário melhor desempenho, conforto e segurança.			
Valor do Projeto:	R\$ 740.000,00	Realizado até 2010:	R\$ 290.830,00
Geração Própria		R\$ 502.000,00	(Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011)
Créditos aprovados em 2011:		R\$ 502.000,00	Meta Física: 68,0 %
Recursos Disponíveis		R\$ 125.500,00	
Total compromissado		R\$ 471.070,00	
Realizado em 2011:		R\$ 101.070,00*	Execução Física: 13,7 %
Resultados Alcançados até 2010			
Serviço de modernização dos elevadores do Edifício Sede da CDRJ – contrato C-SUPJUR 097/2009 com ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A – pagamento da 1ª a 4ª parcelas e respectivos reajustamentos.			
Resultados Alcançados em 2011			
Serviço de modernização dos elevadores do Edifício Sede da CDRJ – contrato C-SUPJUR 097/2009 com ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A – pagamento da 5ª parcela.			
*Conforme determinação da DIREXE em sua 1914ª reunião de 15/02/11, efetivada a reserva para regularização da NF-e nº 37182 de Elevadores Atlas Schindler referente ao contrato C-SUPJUR 097/09, conforme CI DIVMAP Nº 945/11.			
A Realizar			
Pagamento das demais parcelas referentes ao contrato 097/2009 e modernização dos elevadores do Porto do Rio de Janeiro.			

12) Projeto: 26.305.1458.20BA.0033			
Ação: Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza			
Finalidade: Combater o risco de entrada e a disseminação do vírus da influenza aviária ou de um eventual subtipo viral responsável por uma nova pandemia de influenza no território nacional.			
Valor do Projeto:	R\$ 877.000,00	Realizado até 2010:	R\$ 0,00
Orçamento Fiscal / 2011		R\$ 777.000,00	(Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011)
Créditos aprovados em 2011:		R\$ 777.000,00	Meta Física: 89,0 unid
Recursos Disponíveis		R\$ 777.000,00	
Total compromissado		R\$ 395.477,91	
Realizado em 2011:		R\$ 55.010,00	Execução Física: 6,3 unid
Resultados Alcançados até 2010			
Não há realizações no período.			
Resultados Alcançados em 2011			
Serviços de fornecimento e instalação de salas de videoconferência nos Portos do Rio de Janeiro e Itaguaí (RJ).			
A Realizar			
Contratação de empresa especializada para implantação de Projeto Executivo e construção da Unidade de Esterilização de Resíduos Sólidos.			

13) Projeto: 26.784.1458.3E70.0033			
Ação: Recuperação do Acesso Rodoferroviário do Porto do Rio de Janeiro.			
Finalidade: Melhorar os acessos rodoviários e desobstruir o ramal ferroviário Arará/Jacarezinho de acesso ao Porto do Rio de Janeiro.			
Valor do Projeto:	R\$ 10.000.000,00	Realizado até 2010:	R\$ 4.867.272,00
Saldo Financeiro		R\$ 4.479.540,00	(Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011)
Créditos aprovados em 2011:		R\$ 4.479.540,00	Meta Física: 42,0 %
Recursos Disponíveis		R\$ 4.479.540,00	
Total compromissado		R\$ 0,00	
Realizado em 2011:		R\$ 0,00	Execução Física: 0,0 %
Resultados Alcançados até 2010			
Convênio Ferroviário - Pagamento das indenizações cobertas da 1ª a 6ª prestações de contas – Convênio de Apoio Técnico e Financeiro relativo às indenizações de 350 famílias – C-SUPJUR 79/2005 - concluído;			
Convênio Rodoviário - 1ª e 2ª Prestação de Contas apresentada pela Prefeitura do Rio de Janeiro – 1ª e 2ª medições dos serviços de obras do acesso viário ao Porto do Rio de Janeiro, pela Delta Construções S.A - em andamento.			
Resultados Alcançados em 2011			
Não há realizações no exercício.			
A Realizar			
Aguardando a prestação de contas referente ao convênio com a Prefeitura para o acesso rodoviário.			

14) Projeto: 26.784.1458.3E72.0033			
Ação: Implantação de Balanças no Porto do Rio de Janeiro.			
Finalidade: Implantação de balanças para controle de carga e pesagem de veículos e/ou mercadorias.			
Valor do Projeto:	R\$ 515.890,00	Realizado até 2010:	R\$ 118.597,39
Restos a Pagar		R\$ 103.178,00	(Decreto s/nº, de 24/06/2011)
Créditos aprovados em 2011:		R\$ 103.178,00	Meta Física: 20,0%
Recursos Disponíveis		R\$ 0,00	
Total compromissado		R\$ 0,00	
Realizado em 2011:		R\$ 0,00	Execução Física: 0,0 %
Resultados Alcançados até 2010			
Pagamento da 1ª a 8ª medições – fornecimento, montagem, instalação e aferição de balanças para controle de carga e pesagem de veículo e mercadoria – SATEC IND E COM LTDA – C-SUPJUR 33/2005 Concluído.			
Resultados Alcançados em 2011			
Não há realizações no exercício.			
A Realizar			
--			

15) Projeto: 26.784.1458.3E74.0033			
Ação: Ampliação da Rede Elétrica no Porto do Rio de Janeiro (RJ)			
Finalidade: Ampliar a capacidade e modernizar o sistema de energia elétrica e a iluminação do porto do Rio para atender com qualidade o aumento do consumo interno oriundo dos novos arrendamentos a serem contratados. Nível de iluminação adequado às exigências do ISPS-Code.			
Valor do Projeto:	R\$ 8.000.000,00	Realizado até 2010:	R\$ 2.697.968,36
Saldo Financeiro		R\$ 2.594.301,00	(Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011)
Saldo Financeiro (Mudança de Fonte)		(R\$ 2.251,621,00)	(Portaria nº 124, de 01/06/2011)
Restos a Pagar		R\$ 2.251.621,00	(Portaria nº 124, de 01/06/2011)
Restos a Pagar		R\$ 50.000,00	(Decreto s/nº, de 24/06/2011)
Créditos aprovados em 2011:	R\$ 2.644.301,00	Meta Física:	33,0 %
Recursos Disponíveis	R\$ 342.680,00		
Total compromissado	R\$ 2.336.324,35		
Realizado em 2011:	R\$ 0,00	Execução Física:	0,0 %
Resultados Alcançados até 2010			
Pagamento da 1ª a 11ª medições e reajustamentos referentes à recuperação e modernização do sistema elétrico de média tensão do Porto do Rio de Janeiro – C-SUPJUR 098/2006.			
Resultados Alcançados em 2011			
Não há realizações no exercício.			
A Realizar			
Complementação da modernização do sistema de média tensão do Porto do Rio de Janeiro – em execução. Restando a última medição que aguarda procedimentos da Light. Construção de rede subterrânea de alta tensão no trecho entre a Sub 17/18 e SE-CS – em fase de elaboração do projeto básico. Rede de cabeamento para o sistema de supervisão e monitoramento das subestações elétricas do Porto do Rio de Janeiro – em fase de elaboração do projeto básico.			

16) Projeto: 26.784.1458.3338.0033			
Ação: Construção de Terminal de Minério, Gusa e Produtos Siderúrgicos no Porto de Itaguaí (RJ)			
Finalidade: Construção de Terminal de Minério do Porto de Itaguaí.			
Valor do Projeto:	R\$ 2.470.563,00	Realizado até 2010:	R\$ 893.256,35
Saldo Financeiro		R\$ 37.924,00	(Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011)
Créditos aprovados em 2011:	R\$ 37.924,00	Meta Física:	1,0 %
Recursos Disponíveis	R\$ 0,00		
Total compromissado	R\$ 0,00		
Realizado em 2011:	R\$ 0,00	Execução Física:	0,0 %
Resultados Alcançados até 2010			
Pgto da 1ª a 8ª medições referentes à revitalização e à implementação da iluminação viária no Porto de Itaguaí; Pagamento da 1ª a 3ª medições – Recuperação e pavimentação asfáltica da pista de Itaguaí - contrato 87/2007; Pagamento da 1ª, 2ª e 3ª medições da contratação dos serviços de rede de abastecimento da água do ITAPOR - contrato 26/2008; Pagamento da 1ª e 2ª medições - Alimentação externa do complexo administrativo e portão da Ilha da Madeira do Porto de Itaguaí - contrato nº 070/2008. Serviços de ampliação da rede de drenagem superficial na área do complexo administrativo do Porto de Itaguaí – contrato C-SUPJUR 007/2009 com CONSTRUTORA W.V. LTDA – pagamento da 1ª a 4ª medições e respectivos reajustamentos.			
Resultados Alcançados em 2011			
Não há realizações no exercício.			
A Realizar			
--			

17) Projeto: 26.784.1458.3341.0033			
Ação: Desapropriação para Expansão de Área no Porto de Itaguaí(RJ)			
Finalidade: Desapropriação de áreas com a finalidade de salvaguardar o patrimônio da CDRJ, visando à expansão do Porto de Itaguaí.			
Valor do Projeto:	R\$ 1.795.000,00	Realizado até 2010:	R\$ 1.099.250,12
Geração Própria		R\$ 1.000.000,00	(Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011)
Créditos aprovados em 2011:		R\$ 1.000.000,00	Meta Física: 8.667,0 m²
Recursos Disponíveis		R\$ 250.000,00	
Total compromissado		R\$ 130.813,70	
Realizado em 2011:		R\$ 91.350,13	Execução Física: 791,7 m²
Resultados Alcançados até 2010			
Pagamento de custas judiciais e desapropriações relativas ao Porto de Itaguaí (RJ).			
Resultados Alcançados em 2011			
Pagamento de custas judiciais e desapropriações relativas ao Porto de Itaguaí (RJ).			
A Realizar			
Pagamento de custas judiciais e desapropriações relativas ao Porto de Itaguaí (RJ).			

18) Projeto: 26.122.0807.4101.0033			
Ação: Manutenção e Adequação de Bens Imóveis			
Finalidade: Realizar despesas com manutenção e obras de adequação que prolonguem a vida útil dos bens imóveis e melhorem a qualidade dos serviços prestados aos usuários.			
Valor do Projeto:	#ATIVIDADE#	Realizado até 2010:	--
Geração Própria		R\$ 1.000.000,00	(Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011)
Créditos aprovados em 2011:		R\$ 1.000.000,00	Meta Física: 100,0 %
Recursos Disponíveis		R\$ 250.000,00	
Total compromissado		R\$ 0,00	
Realizado em 2011:		R\$ 0,00	Execução Física: 0,0 %
Resultados Alcançados em 2011			
Não há realizações no exercício.			

19) Projeto: 26.122.0807.4102.0033			
Ação: Manutenção adequação bens móveis, veículos, máquinas e equipamentos.			
Finalidade: Realizar despesas com manutenção e obras de adequação que prolonguem a vida útil dos bens móveis, veículos, máquinas e equipamentos proporcionando melhor qualidade dos serviços prestados aos usuários.			
Valor do Projeto:	#ATIVIDADE#	Realizado até 2010:	--
Geração Própria		R\$ 1.000.000,00	(Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011)
Créditos aprovados em 2011:		R\$ 1.000.000,00	Meta Física: 100,0 %
Recursos Disponíveis		R\$ 500.000,00	
Total compromissado		R\$ 497.034,78	
Realizado em 2011:		R\$ 332.007,58	Execução Física: 33,2 %
Resultados Alcançados em 2011			
1-Aquisição de aparelhos de ar-condicionado, conforme O.F 80/2010: CLIMA RIO 2004 COM. E SERV. DE REFRIGERAÇÃO LTDA. 2-Aquisição de poltronas para auditório, conforme O.F 65/2010. Pagamento da NF N°14154: GIROFLEX S/A. 3-Aquisição de sofás e poltrona, conforme O.F 87/2010. Pagamento da NF N° 7284: AURUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA. 4-Aquisição de estante de aço, conforme O.F 02/2011. Pagamento de NF N° 596: METALURGICA PROAÇO LTDA. 5-Aquisição e instalação de dois aparelhos de ar-condicionado, conforme O.F 80/2010: CLIMARIO 2004 COM. E SERV. DE REFRIGERAÇÃO LTDA 6-Aquisição e instalação de três aparelhos de ar-condicionado, conforme O.F 80/2010: CLIMARIO 2004 COM. E SERV. DE REFRIGERAÇÃO LTDA			

20) Projeto: 26.126.0807.4103.0033			
Ação: Manutenção e Adequação Ativos Informática e Teleprocessamento			
Finalidade: Realizar despesas com manutenção, adequação e aquisição de bens nas áreas de informática, informação e teleprocessamento que prolonguem a vida útil dos ativos de informática nas respectivas áreas e propiciem melhor qualidade dos serviços prestados aos usuários.			
Valor do Projeto:	#ATIVIDADE#	Realizado até 2010:	--
Geração Própria		R\$ 1.000.000,00	(Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011)
Créditos aprovados em 2011:		R\$ 1.000.000,00	Meta Física: 100,0 %
Recursos Disponíveis		R\$ 250.000,00	
Total compromissado		R\$ 656.052,68	
Realizado em 2011:		R\$ 1.153,12	Execução Física: 0,1 %
Resultados Alcançados em 2011			
01-Aquisição de uma impressora de cheque da marca Elgin para DIGEFI, conforme O.F 23/2011: DECISIVA EQUIPAMENTOS PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.			

21) Projeto: 26.784.1458.6504.0033			
Ação: Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio Ambiente			
Finalidade: Proceder a estudos de viabilidade técnica, comercial e ambiental para subsidiar os projetos de aprofundamento dos Portos e os arrendamentos de áreas.			
Valor do Projeto:	#ATIVIDADE#	Realizado até 2010:	R\$ 2.844.058,00
Orçamento Fiscal / 2011		R\$ 4.100.000,00	(Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011)
Saldo Financeiro		R\$ 3.767.876,00	(Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011)
Saldo Financeiro (Mudança de Fonte)		(R\$ 3.257.920,00)	(Portaria nº 124, de 01/06/2011)
Restos a Pagar		R\$ 3.257.920,00	(Portaria nº 124, de 01/06/2011)
Créditos aprovados em 2011:		R\$ 7.867.876,00	Meta Física: 38,0 unid
Recursos Disponíveis		R\$ 509.956,00	
Total compromissado		R\$ 0,00	
Realizado em 2011:		R\$ 0,00	Execução Física: 0,0 unid
Resultados Alcançados até 2010			
Pagamento referente a estudos geotécnicos no canal de acesso ao porto de Itaguaí; Pagamento das parcelas do convênio C-SUPJUR 108/2006 com o CENTRAN – Ministério da Defesa.			
Resultados Alcançados em 2011			
Não há realizações no exercício.			
A Realizar			
Consultoria com foco na Análise e Desenvolvimento de Projetos Básicos e Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) de empreendimentos portuários – processo encaminhado para análise da SUPJUR.			
Consultoria com foco na Análise e Avaliação dos Ativos Imobiliários da CDRJ – Termo de Referência em elaboração pela DIMACO.			
Consultoria com foco na Análise e Avaliação da Infraestrutura Tarifária da CDRJ – enviado para análise e decisão da DIREXE.			
Consultoria para o Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Implantação de Instrumentos de Gestão – Termo de Referência em elaboração pela DINFOR.			

22) Projeto: 26.784.1458.7376.0033			
Ação: Dragagem de Aprofundamento Canal de Acesso e Bacia de Evolução do Porto de Itaguaí (RJ)			
Finalidade: Alargar trecho do canal de acesso com 150 metros de largura e aprofundar o calado para 20 metros, decorrentes da demanda crescente de cargas ao porto, tais como: minério, carvão, soja e contêineres.			
Valor do Projeto:	R\$ 380.733.300,00	Realizado até 2010:	R\$ 104.551.702,03
Saldo Financeiro		R\$ 1.896.300,00	(Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011)
Créditos aprovados em 2011:		R\$ 1.896.300,00	Meta Física: 1,0 mil m³
Recursos Disponíveis		R\$ 1.448.298,00	
Total compromissado		R\$ 292.989,00	
Realizado em 2011:		R\$ 0,00	Execução Física: 0,0 mil m³
Resultados Alcançados até 2010			
Pagamento da 1ª a 10ª medições e respectivos reajustes do contrato com a firma Bandeirantes – dragagem de infraestrutura aquaviário de acesso ao Porto de Itaguaí – DEPJUR 18/2000; Pagamento da 1ª a 10ª medições do contrato com a firma Ster Engenharia Ltda – Dragagem do acesso aquaviário do Porto de Itaguaí – C-SUPJUR 035/2008.			
Serviços de caracterização morfo-acústica do corpo rochoso existente no canal de acesso ao Porto de Itaguaí – contrato C-SUPJUR 028/2010 com MICROARS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA – pagamento da 1ª a 3ª medições.			
Serviços de sondagens subaquáticas por jet-probe na área de influência do corpo rochoso existente no canal de acesso ao Porto de Itaguaí - contrato C-SUPJUR 041/2010 com HIDROTOPO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA – pagamento da medição única.			
Resultados Alcançados em 2011			
Não há realizações no exercício.			
A Realizar			
Consultoria e estudos ambientais para dragagem de áreas de fundeio no acesso aquaviário ao Porto de Itaguaí (RJ) – contrato C-SUPJUR 20/2011 com PH MAR CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA – assinado em 15/04/2011.			
Caracterização geológico-geotécnica do corpo rochoso existente no canal de acesso ao Porto de Itaguaí (RJ)			


23) Projeto: 26.784.1458.7390.0033			
Ação: Implantação do Sistema de Sinalização Náutica do Porto de Itaguaí			
Finalidade: Implantação de sinalização náutica de alto desempenho e durabilidade para a segurança da navegação nos canais e bacias de evolução do acesso aquaviário do Porto de Itaguaí, em cumprimento aos ditames da Lei 8630/93.			
Valor do Projeto:	R\$ 4.000.000,00	Realizado até 2010:	R\$ 1.240.000,00
Restos a Pagar		R\$ 1.760.000,00	(Decreto s/nº, de 24/06/2011)
Créditos aprovados em 2011:		R\$ 1.760.000,00	Meta Física: 13,0%
Recursos Disponíveis		R\$ 0,00	
Total compromissado		R\$ 0,00	
Realizado em 2011:		R\$ 0,00	Execução Física: 0,0%
Resultados Alcançados até 2010			
Fornecimento de equipamentos de sinalização náutica para o Porto de Itaguaí.			
Resultados Alcançados em 2011			
Não há realizações no exercício.			
A Realizar			
Aquisição de acessórios dos sinais flutuantes e faróis para o sistema de balizamento náutico NORMAM 17 Marinha do Brasil - em fase de elaboração do Projeto Básico.			

24) Projeto: 26.784.1458.7412.0033			
Ação: Obras de Demarcação e Proteção das Áreas do Porto de Itaguaí (RJ)			
Finalidade: Limitar, cercar e proteger os limites da área do Porto Organizado de Itaguaí.			
Valor do Projeto:	R\$ 2.133.000,00	Realizado até 2010:	R\$ 0,00
Saldo Financeiro		R\$ 2.133.000,00	(Lei 12.381 – Suplemento, de 02/03/2011)
Saldo Financeiro (Mudança de Fonte)		(R\$ 2.133.000,00)	(Portaria nº 124, de 01/06/2011)
Restos a Pagar		R\$ 2.133.000,00	(Portaria nº 124, de 01/06/2011)
Créditos aprovados em 2011:		R\$ 2.133.000,00	Meta Física: 100,0 %
Recursos Disponíveis		R\$ 0,00	
Total compromissado		R\$ 0,00	
Realizado em 2011:		R\$ 0,00	Execução Física: 0,0 %
Resultados Alcançados até 2010			
Não há realizações no período.			
Resultados Alcançados em 2011			
Não há realizações no exercício.			
A Realizar			
Previsão de fornecimento e instalação de cercas para proteção de áreas no Porto de Itaguaí (RJ).			


ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS (agrupado por ações) Junho / 2011									
R\$ 1,00									
AÇÃO		Lei + Créditos	Meta Física	Compromissado	Disponível	Empenhado	Realizado		Realizado/Disponível
Código	Descrição						R\$	Físico	
10VS	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS-CODE) no Porto de Itaguaí (RJ) Saldo Financeiro Restos a Pagar	7.567.131 4.567.131 3.000.000	47,0 % 28,4 18,6	1.803.863 1.803.863 0	1.803.863 1.803.863 0	521.973 521.973 0	521.973 521.973 0	3,2 % 3,2 0,0	28,9 % 28,9 0,0
10VW	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS-CODE) no Porto do Rio de Janeiro (RJ) Saldo Financeiro Restos a Pagar	10.543.979 7.543.979 3.000.000	40,0 % 28,6 11,4	1.655.332 1.655.332 0	7.543.979 7.543.979 0	30.711 30.711 0	30.711 30.711 0	0,1 % 0,1 0,0	0,4 % 0,4 0,0
100Y	Recuperação da Pavimentação das Vias Internas do Porto do Rio de Janeiro (RJ) Geração Própria	1.300.000 1.300.000	45,0 % 45,0	1.294.172 1.294.172	325.000 325.000	0 0	0 0	0,0 % 0,0	0,0 % 0,0
11HG	Implantação do Sistema de Defensas no Porto do Rio de Janeiro (RJ) Orçamento Fiscal / 2011 Saldo Financeiro	3.066.476 1.358.000 1.708.476	31,0 % 13,7 17,3	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,0 % 0,0 0,0	0,0 % 0,0 0,0
12IE	Recuperação do Sistema Viário Interno do Porto de Itaguaí (RJ) Saldo Financeiro Restos a Pagar	985.436 476.985 508.451	10,0 % 4,8 5,2	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,0 % 0,0 0,0	0,0 % 0,0 0,0
12IG	Implantação de Centro Avançado de Controle de Tráfego no Porto de Itaguaí (RJ) Orçamento Fiscal / 2011 Saldo Financeiro	10.033.923 7.000.000 3.033.923	80,0 % 55,8 24,2	0 0 0	3.032.923 0 3.032.923	0 0 0	0 0 0	0,0 % 0,0 0,0	0,0 % 0,0 0,0
12II	Complementação das Obras do Complexo Administrativo Portuário no Porto de Itaguaí (RJ) Orçamento Fiscal / 2011	600.000 600.000	100,0 % 100,0	0 0	0 0	0 0	0 0	0,0 % 0,0	0,0 % 0,0
12LG	Reforço Estrutural do Cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro (RJ) Orçamento Fiscal / 2011	12.000.000 12.000.000	25,0 % 25,0	0 0	0 0	0 0	0 0	0,0 % 0,0	0,0 % 0,0
12LH	Reforço Estrutural do Cais de São Cristóvão no Porto do Rio de Janeiro (RJ) Orçamento Fiscal / 2011	8.000.000 8.000.000	37,0 % 37,0	0 0	0 0	0 0	0 0	0,0 % 0,0	0,0 % 0,0
12LI	Implantação de 3 Pieres de Atracação no Porto do Rio de Janeiro (RJ) Orçamento Fiscal / 2011 Restos a Pagar	78.000.000 47.000.000 31.000.000	26,0 % 15,7 10,3	2.859.008 0 2.859.008	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,0 % 0,0 0,0	0,0 % 0,0 0,0
131E	Modernização de Elevadores da Sede da CDRJ e do Porto do Rio de Janeiro Geração Própria	502.000 502.000	68,0 % 68,0	471.070 471.070	125.500 125.500	101.070 101.070	101.070 101.070	13,7 % 13,7	80,5 % 80,5
20BA	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza Saldo Financeiro	777.000 777.000	89,0 unid 89,0	395.478 395.478	777.000 777.000	55.010 55.010	55.010 55.010	6,3 unid 6,3	7,1 % 7,1
3E70	Recuperação do Acesso Rodoferryviário do Porto do Rio de Janeiro (RJ) Saldo Financeiro (Saldo de Rendimentos) Saldo Financeiro	4.479.540 0 4.479.540	62,0 % 20,0 42,0	0 0 0	4.479.540 0 4.479.540	0 0 0	0 0 0	0,0 % 0,0 0,0	0,0 % 0,0 0,0
3E72	Implantação de Balanços no Porto do Rio de Janeiro (RJ) Restos a Pagar	103.178 103.178	20,0 % 20,0	0 0	0 0	0 0	0 0	0,0 % 0,0	0,0 % 0,0
3E74	Ampliação da Rede Elétrica no Porto do Rio de Janeiro (RJ) Saldo Financeiro Restos a Pagar	2.644.381 342.680 2.301.621	33,0 % 4,3 28,7	2.336.324 342.680 1.993.644	342.680 342.680 0	0 0 0	0 0 0	0,0 % 0,0 0,0	0,0 % 0,0 0,0
3338	Construção do Terminal de Minério, Gusa e Produtos Siderúrgicos no Porto de Itaguaí (RJ) Saldo Financeiro	37.924 37.924	1,0 % 1,0	0 0	0 0	0 0	0 0	0,0 % 0,0	0,0 % 0,0
3341	Desapropriação para Expansão de Área no Porto de Itaguaí (RJ) Geração Própria	1.000.000 1.000.000	8.667,0 m² 8.667,0	296.195 296.195	750.000 750.000	295.764 295.764	295.764 295.764	2.563,4 m² 2.563,4	39,4 % 39,4
4101	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis Geração Própria	1.000.000 1.000.000	100,0 % 100,0	0 0	250.000 250.000	0 0	0 0	0,0 % 0,0	0,0 % 0,0
4102	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos Geração Própria	1.000.000 1.000.000	100,0 % 100,0	497.035 497.035	500.000 500.000	332.008 332.008	332.008 332.008	33,2 % 33,2	66,4 % 66,4
4103	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento Geração Própria	1.000.000 1.000.000	100,0 % 100,0	656.053 656.053	250.000 250.000	1.153 1.153	1.153 1.153	0,1 % 0,1	0,5 % 0,5
6504	Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio Ambiente Orçamento Fiscal / 2011 Saldo Financeiro Restos a Pagar	7.867.876 4.100.000 509.956 3.257.920	38,0 unid 19,8 2,5 15,7	0 0 0 0	509.956 0 509.956 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0,0 unid 0,0 0,0 0,0	0,0 % 0,0 0,0 0,0
7376	Dragagem de Aprofundamento Canal de Acesso e Bacia de Evolução do Porto de Itaguaí (RJ) Saldo Financeiro	1.896.300 1.896.300	1,0 mil m³ 1,0	292.989 292.989	1.448.290 1.448.290	0 0	0 0	0,0 mil m³ 0,0	0,0 % 0,0
7390	Implantação de Sistema de Sinalização Náutica no Porto de Itaguaí (RJ) Restos a Pagar	1.760.000 1.760.000	13,0 % 13,0	0 0	0 0	0 0	0 0	0,0 % 0,0	0,0 % 0,0
7412	Obras de Demarcação e Proteção das Áreas do Porto de Itaguaí (RJ) Saldo Financeiro Restos a Pagar	2.133.000 0 2.133.000	100,0 % 0,0 100,0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,0 % 0,0 0,0	0,0 % 0,0 0,0
TOTAL		150.298.064		12.557.518	22.138.739	1.337.689	1.337.689	0,8 %	6,0 %

GRÁFICOS INVESTIMENTOS – 2011

Recursos do Tesouro - 2011

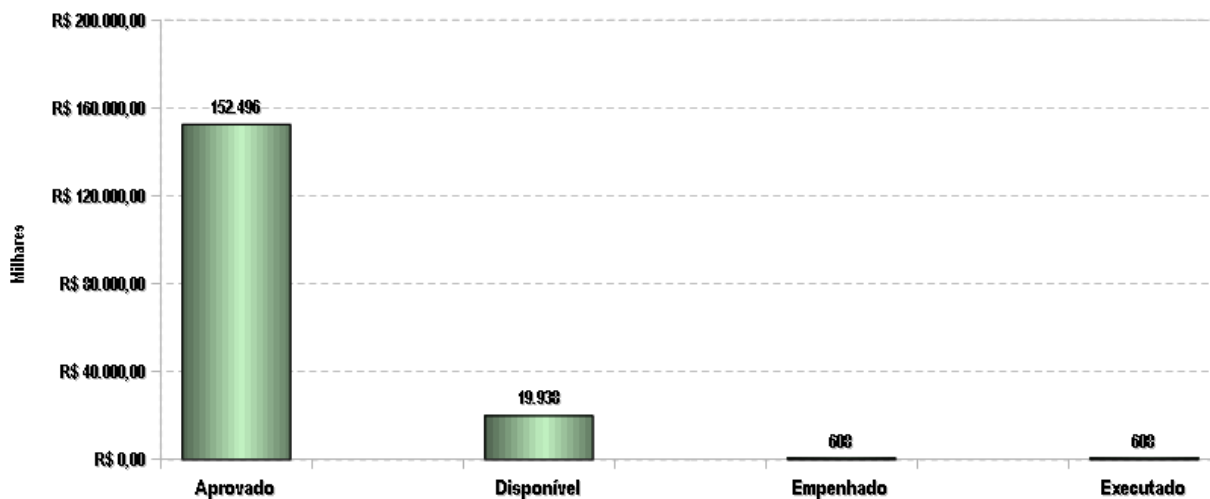

Recursos Próprios - 2011

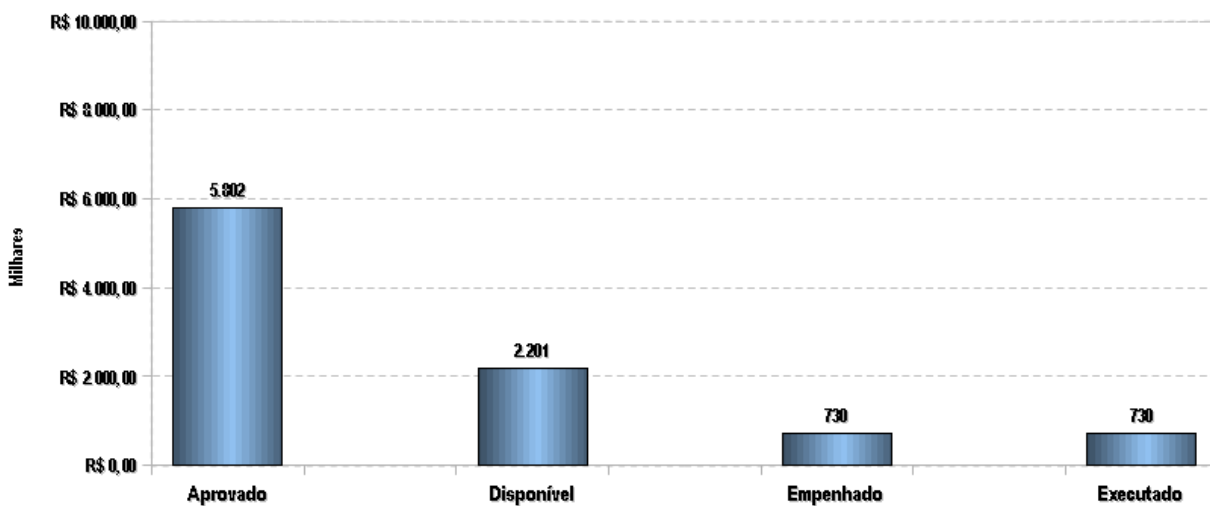

TOTAL POR FONTE DE RECURSO		Lei + Créditos	Compromissado	Disponível	Empenhado	
FONTE:	RECURSOS PRÓPRIOS	5.802.000,00	3.214.523,61	2.200.500,00	729.995,11	729.995,11
FONTE:	RECURSOS TESOURO	152.496.064,00	9.342.994,23	19.938.239,00	607.693,68	607.693,68
TOTAL GERAL		158.298.064,00	12.557.517,84	22.138.739,00	1.337.688,79	1.337.688,79
